SINAC
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
COSTA RICA

Sistematización

Plan de Manejo Zona Protectora Cerros de Escazú

Sistematización Plan de Manejo Zona Protectora Cerros de Escazú

Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC)

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)
2015

Publicado por: SINAC. Sistema Nacional de Áreas de Conservación

Donado por: Asociación Costa Rica por Siempre

Elaboración técnica: Adriana Fernández Sánchez, Marcia Carranza Vargas, Marco Hidalgo Chaverri,

Copyright: © 2015. Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)

Esta publicación puede citarse sin previa autorización con la condición que se mencione la fuente

Citar como: SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). 2015. Sistematización del proceso de elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú. Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), Costa Rica. 115p.

El proceso de facilitación de este Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú, fue llevado a cabo mediante un acuerdo de donación por Costa Rica Por Siempre y fue posible gracias al apoyo técnico y financiero del Segundo Canje de Deuda por Naturaleza entre Costa Rica y Estados Unidos, la Asociación Costa Rica Por Siempre y del personal del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC).

La Asociación Costa Rica Por Siempre es una organización sin fines de lucro que administra una iniciativa de conservación público-privada desarrollada con el objetivo de consolidar un sistema de áreas protegidas marinas y terrestres que sea ecológicamente representativo, efectivamente manejado y con una fuente estable de financiamiento, permitiéndole a Costa Rica ser el primer país en desarrollo en cumplir las metas del Programa de Trabajo en Áreas Protegidas (“PTAP”) de la Convención sobre Diversidad Biológica (“CDB”) de las Naciones Unidas.

ISBN:

Asesoría Técnica: Asociación Costa Rica Por Siempre (“ACRXS”)
Financiamiento: Segundo Canje de Deuda

ACRÓNIMOS

ACOPAC: Área de Conservación Pacifico Central

ACRXS: Asociación Costa Rica por Siempre

AyA: Acueductos y Alcantarillados

CNE: Comisión Nacional de Emergencia

CORAC: Consejo Regional de Áreas de Conservación

CS: Comité de Seguimiento

EFM: Elementos Focales de Manejo

FN: Fundación Neotrópica

FONAFIFO: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal

IMN: Instituto Meteorológico Nacional

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería

PGM: Plan General de Manejo

SENARA: Sistema Nacional de Riego y Avenamiento

SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación

TIQ: Territorio Indígena Quitirrisí

ZP: Zona Protectora

ZPCE: Zona Protectora Cerros de Escazú

Contenido

1. Resumen Ejecutivo del Plan de Manejo de la ZPCE 6

2. Metodología utilizada para la construcción participativa del Plan de Manejo de la ZPCE 8

Etapa 1. Génesis del proceso 8

Etapa 2. Dando a conocer el proceso a las comunidades 9

Etapa 3. Elementos Focales de Manejo y Diagnóstico 10

Etapa 4. Formulando los programas y líneas de acción del PGM 13

Etapa 5. Construcción de la Zonificación 13

Etapa 6. Validación del Plan de Manejo e inicio del proceso de oficialización 15

Estrategias transversales al proceso 16

3. Lecciones aprendidas 17

4. Registros de reuniones 18

4.1 Minutas-Comité de Seguimiento 18

4.2 Sesiones especiales con ACOPAC 43

4.3 Sesiones especiales con Jorge Cole (Actuar)- Proceso de información Territorio indígena Quitirrisi (TIQ) 47

5. Registro de los talleres con actores 51

6. Presentación del Plan de Manejo ante el CORAC – Sesión extraordinaria 113

1. Resumen Ejecutivo del Plan de Manejo de la ZPCE

La Zona Protectora Cerros de Escazú (ZPCE) se crea en 1976, Decreto Ejecutivo Nº 6112, con el fin de proteger la conectividad de los parches de bosque, así como de las nacientes de agua de la zona. Su extensión es de 7.175 hectáreas distribuido en seis cantones Santa Ana, Mora, Escazú, Acosta, Alajuelita y Aserrí. La visión y la misión de esta zona protectora, están en función de los servicios ecosistémicos de su categoría de manejo, y orienta el aprovechamiento de sus recursos naturales y preservar las áreas de bosque del Valle Central.

El presente Plan General de Manejo tiene como objetivo promover la gestión, manejo y conservación de la Zona Protectora Cerros de Escazú, para asegurar el uso sostenible de los servicios ecosistémicos, generando bienestar humano para las comunidades locales y organizaciones, durante el período 2015-2025. El mismo se construyó en forma conjunta y participativa con los diversos grupos sociales que asistieron a los talleres. En total se realizaron 15 talleres distribuidos en las comunidades de Acosta, Aserrí y Santa Ana, en el periodo febrero- octubre 2015, en los cuales se cubrieron los siguientes temas: presentación general del proyecto (115 participantes), validación del diagnóstico, elementos focales de manejo y mapeo de actores (73 participantes), validación y construcción de las líneas de acción (69 participantes), presentación de la zonificación (62 participantes) y presentación final del Plan General de Manejo (75 participantes).

Con la información recopilada tanto en el diagnóstico como en los talleres se construyó el presente documento de Plan General de Manejo el cual incluye un análisis de secciones como: marco legal, principales hallazgos del diagnóstico, elementos focales de manejo, servicios ecosistemicos que brinda la ZPCE, mapeo de actores, zonificación, programas estratégicos, modelo de gestión, seguimiento y evaluación, y presupuesto de la ZPCE.

La sección de “marco legal” realiza un breve análisis de la creación de la ZPCE, así como los detalles de su delimitación. Dentro de este contexto resulta importante mencionar que mediante Decreto Ejecutivo 29452-G se amplió la Reserva Indígena Quitirrisí, ampliando sus límites, siendo que una parte del territorio comprendido por esta se encuentra dentro de los límites de la Zona Protectora.

Seguidamente, se presenta los principales hallazgos del proceso del diagnóstico. Donde se destaca que la ZPCE posee importantes recursos naturales de tipo hídrico, biológico y forestal, convirtiéndose en un área estratégica dentro de la Gran Área Metropolitana. A su vez, uno de los elementos importantes en relación a los Cerros de Escazú es la cotidianidad rural expresada en prácticas propias de este contexto y que representan hitos dentro del patrimonio cultural de la región.

Se definieron tres Elementos Focales de Manejo (EFM) que representan los valores de la ZPCE: paisaje, recurso hídrico y ruralidad. A su vez, se identificaron como principales amenazas antropogénicas que afectan estos EFM: la deforestación, contaminación por residuos sólidos, expansión urbana e inmobiliaria, expansión de la frontera agrícola dentro de la ZPCE y prácticas agrícolas inadecuadas. Es importante destacar que dentro de la ZPCE, se identifican amenazas naturales como deslizamientos de gran magnitud, fuertes pendientes y cambio climático.

Por su parte, en esta Zona Protectora (ZP) se encuentran vinculados diversidad de actores de manera directa o indirecta los cuales mantienen distintos usos de los recursos y / o generan alguna presión sobre la zona. En total se identifican 101 actores clave, donde 42% son del sector comunal organizado.

En cuanto la zonificación, esta se construyó en forma conjunta y participativa con los diversos grupos sociales. Se generaron cuatro zonas de intervención para la ZPCE: Zona de Mínima Intervención, Zona de Baja Intervención, Zona de Mediana Intervención y Zona de Alta Intervención.

Asimismo, se diseñó el plan de acción de la ZPCE basado en cinco componentes estratégicos, los cuales están integrados por objetivos y metas, que a su vez son implementadas por acciones y medios de verificación, estos son: 1. Gerencia institucional 2. Control, Protección y Gestión del Riesgo 3. Conservación, Uso sostenible de la Biodiversidad y Gestión de Servicios de los Ecosistemas 4. Alianzas y Participación con la Sociedad 5. Turismo Sostenible.

En lo referente al modelo de gestión, se detalla las oportunidades de manejo para la ZPCE, tomando en cuenta los factores internos y externos de la ZP. Se analiza la gestión actual del área protegida, donde se destaca que la cantidad de recursos financieros no permite realizar las actividades destinadas a la ZP, además de no tener una sede administrativa para su gestión. Por otro lado el no contar con una instancia formal de gestión y participación ciudadana, limita los alcances de concertación de los espacios de participación ciudadana y desatiende la institucionalidad. Ante este escenario se describe una propuesta de modelo de gestión para la ZP.

Finalmente, se detalla el seguimiento y evaluación de Plan General de Manejo, para lo cual se sugiere la conformación del Consejo Local de la ZPCE. Se describe la ruta de aprobación del Plan de Manejo, la ruta a seguir para la solicitud de permisos dentro de la ZP, y la divulgación del Plan General de Manejo por parte de ACOPAC. Asimismo, se detalla el presupuesto para implementar el Plan de Manejo de la ZPCE 2015 – 2025.

2. Metodología utilizada para la construcción participativa del Plan de Manejo de la ZPCE

Esta experiencia se puede dividir en seis etapas bien definidas que se describen a continuación. La definición de las etapas se basó en las situaciones que se tuvieron que ir resolviendo en cada una de los periodos metodológicos.

Etapa 1. Génesis del proceso

El proceso per se de elaboración del Plan General de Manejo de la ZPCE se remonta a setiembre 2014, cuando a través del segundo canje de deuda por naturaleza, se adjudica el Proyecto a la Fundación Neotrópica y se firma el acuerdo de donación entre Fundación Neotrópica y la Asociación Costa Rica por Siempre (ACRxS).

En octubre 2014, se convoca a una primera reunión a las diferentes partes interesadas (ACOPAC, Municipalidades, Secretaria Ejecutiva SINAC, ACRxS) con el fin de presentar y discutir el proceso a seguir para dar inicio a la ejecución del proyecto. Es en esta reunión donde por acuerdo unánime se conforma el *"Comité de Seguimiento del Proyecto"* que actúa como el equipo de planificación del proceso, encargado de velar por la adecuada ejecución del proyecto, así como la aprobación de los productos técnicos elaborados por Fundación Neotrópica. Este Comité está conformado por las siguientes personas:

- Gerardo Chavarría Amador (ACOPAC)
- Efraín Monge Hernández (ACOPAC)
- Andrea Montero (Asociación Costa Rica por Siempre)
- Marco Vinicio Araya (Secretaría Ejecutiva-SINAC)
- Grettel Agüero Alfaro (Representante de las Municipalidades)
- Helmut Johnson M. (Representante de las Municipalidades)

Un aspecto importante a resaltar en esta etapa es el interés de las Municipalidades circunscritas en la Zona Protectora, para convertirse en actores más participativos de este proceso, y la anuencia de colaborar en lo que se solicite. Este interés fue expuesto en esta primera reunión donde se acuerda contar con dos representantes municipales en el Comité de Seguimiento, los cuales representarían a las 6 Municipalidades que conforman la ZPCE (Escazú, Santa Ana, Mora, Acosta, Aserrí y Alajuelita) y brindarían un aporte técnico importante durante la elaboración del PGM.

Etapa 2. Dando a conocer el proceso a las comunidades

En febrero 2015, se inicia la ejecución de los primeros talleres dirigidos a las comunidades. Al estar la ZPCE compartida por 6 cantones, la ejecución de talleres durante todo el proceso de Plan de Manejo se organizó en 3 sectores.

Sector	Sede del taller
Acosta	Municipalidad de Acosta
Aserrí, Alajuelita	Municipalidad de Aserrí
Mora, Escazú, Santa Ana	Santa Ana

Se inició con el taller "*Presentación del Proyecto de Elaboración del Plan General de Manejo para la Zona Protectora Cerros de Escazú"* el cual tuvo como objetivo dar a conocerla la ruta del proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la ZPCE a los actores locales, instituciones, organizaciones, etc., así como informar sobre los espacios existentes para participar activamente en este proceso, los pasos a seguir y la manera de trabajar. Asimismo, se abrió un espacio para despejar dudas y preguntas sobre el proceso de elaboración del Plan de Manejo.

Este taller confirmó las preocupaciones de los actores en cuanto a tenencia de la tierra, usos permitidos del suelo y regulaciones al respecto. También se dieron discusiones de ámbito más técnico sobre el contenido que tendría el diagnóstico y la propuesta de zonificación. Se logró contestar a las preguntas; y los/as participantes salieron del taller más informados/as y con mayor claridad sobre el proceso.

Para este primer taller participaron un total de 115 personas, distribuidos en los 3 sectores.

Como primer paso en la planificación de talleres, Fundación Neotrópica presenta el "Detalle metodológico del taller" al Comité de Seguimiento para su aprobación, el cual una vez avalado, inicia la convocatoria en conjunto con ACOPAC; esto por medio de correo electrónico e invitaciones en físico.

Etapa 3. Elementos Focales de Manejo y Diagnóstico

Esta etapa inicia con la identificación de los Elementos Focales de Manejo (EFM), sus usos y amenazas, y a partir de esto se generó el diagnóstico y demás componentes del proceso.

"Los elementos focales de manejo son la columna vertebral del Plan de Manejo"

Marco Hidalgo, Fundación Neotropica

"*Son elementos que representan los valores de la Zona Protectora"*

Adriana Fernández, Fundación Neotropica

Fundación Neotropica presentó en febrero 2015 una propuesta de EFM al Comité de Seguimiento para su aprobación; la cual se basó en lo estipulado en el Decreto de creación de la Zona Protectora. (Decreto Ejecutivo N° 6112-A)

"Su objetivo principal de creación es orientar el aprovechamiento de los recursos naturales, intentar preservar las áreas de bosque y proteger el recurso hídrico presente en el sitio, el cual abastece a las poblaciones de los cantones citados". Decreto Ejecutivo N° 6112-A

Los EFM aprobados por el Comité de Seguimiento fueron: Paisaje, recurso hídrico y ruralidad.

1.Paisaje	2.Recurso hídrico	3. Ruralidad
• Bosque • Agricola • Urbano	• Rios • Quebradas • Nacientes y pozos	• Cotidianidad rural • Patrimonio cultural de la zona

Como elemento innovador de esta propuesta se destaca la "ruralidad" que tiene la particularidad de ser un elemento cultural. Esto obedece a que la ruralidad es un elemento identitario transversal en los seis cantones que forman parte de la ZPCE, expresado en prácticas propias de este contexto y que representan hitos dentro del patrimonio cultural de la región.

Posteriormente, para la elaboración del documento de diagnóstico se llevaron a cabo 2 tareas:

- **Recopilación de información secundaria y primaria:** Se hizo una revisión de documentos (tesis, estudios, artículos, prensa, boletines, informes técnicos, diagnósticos, entre otros) y se integraron en una base de datos con información social, económica, registral, legal y biológica del área de estudio. La búsqueda de estos documentos se hizo a través de solicitudes formales de información a diferentes instituciones públicas u organizaciones y el ACOPAC, asimismo, se hizo una búsqueda en internet y bibliotecas.

  El proceso de solicitud de información a instituciones públicas (Municipalidades, ACOPAC, Registro Nacional, INTA, FONAFIFO, AyA, SENARA, IMN, CNE, ect) fue bastante complejo y extenso, el cual inicio en octubre 2014 y finalizó en marzo 2015, esto debido a diferentes situaciones:

  - Atraso en el envío de información catastral y de tenencia de la tierra por parte de las Municipalidades. Muchas no cuentan con el catastro completo y tienen grandes vacíos de información en esta área, y otras mostraron resistencia a brindar la información en formato Shape.
  - Procesos burocráticos que hacen que la entrega de información sea muy tardía
  - Limitaciones para suministrar información a Fundación Neotrópica por no ser una entidad gubernamental. La mayoría de solicitudes debían ser tramitadas por ACOPAC, lo que atrasaba aún más el acceso a la información.
  - La información con que contaba ACOPAC sobre la Zona Protectora era muy limitada.

- **Análisis y elaboración del documento diagnóstico, según el procesamiento de la información**: Una vez recopilada la información necesaria, se contrastó la información secundaria y primaria con los datos obtenidos en giras de campo y consultas telefónicas. Se procedió a su análisis y elaboración del diagnóstico.

Una vez elaborado el primer borrador de diagnóstico, este fue presentado al Comité de Seguimiento para su revisión. Fundación Neotrópica incorpora las correcciones emitidas por el Comité de Seguimiento, y este da la aprobación para ser presentado a las comunidades

En abril 2015, se inicia con los talleres de "*Presentación del Diagnostico socioambiental y económico, Elementos Focales de Manejo y mapeo de actores"* con el objetivo de facilitar un proceso de participación local en el enriquecimiento de información y consolidación del documento, y validación de la propuesta de EFM. En estos talleres participaron un total de 73 personas.

De manera general, los participantes brindaron diferentes aportes al documento de diagnóstico y validaron la propuesta de EFM. Existe una buena disposición de los/as participantes para interactuar, dialogar y construir conjuntamente el Plan de Manejo. Se observa un fuerte interés para que el Plan de Manejo sea elaborado en el mejor plazo posible, sobre todo por las restricciones, la incertidumbre, y los bloqueos institucionales que supone la ausencia de un Plan de Manejo en la actualidad. El día del taller se informa que se brinda una semana de tiempo para que envíen comentarios al diagnóstico (el documento se envía a todos los actores por correo electrónico).

"Tenemos apertura al manejo controlado, que se permita desarrollo sostenible (turismo, agricultura, habitacional"

Taller presentación del diagnóstico, Salón Comunal Santa Ana

Los amplios insumos brindados durante y post taller fueron utilizados para finalizar la construcción del diagnóstico de la ZPCE, de manera que el mismo contará con la validación de los diferentes actores comunales.

Es así como en agosto 2015, después del procesamiento de la información brindada por los actores, y una vez finalizado el estudio de suelos de la ZPCE generado por el INTA (insumo importante para el diagnóstico y zonificación) se entrega al Comité de Seguimiento el documento final " Diagnostico socio ambiental y económico de la ZPCE" para su aprobación.

Este fue un período de gran relevancia para la elaboración del PGM, ya que la calidad y profundidad de la información colectada y generada fueron claves para lograr un retrato actual de la situación de la ZPCE.

Cada producto generado por Fundación Neotrópica en este proceso, es presentado primeramente al Comité de Seguimiento para su revisión y aprobación. Una vez aprobado, este se presenta a las comunidades.

Etapa 4. Formulando los programas y líneas de acción del PGM

Fundación Neotropica, hizo una propuesta de programas y líneas de acción del PGM al Comité de Seguimiento para su validación. Estos componentes estratégicos están integrados por objetivos y metas, que a su vez son implementados por acciones y medios de verificación.

En mayo 2015, se llevaron a cabo los talleres de *"Validación y construcción de Líneas de Acción",* que tuvieron como objetivo presentar y validar la propuesta de líneas de acción del PGM, y recibir retroalimentación por parte de los asistentes. En total asistieron 69 personas.

De manera general, los participantes aportaron excelentes insumos que enriquecieron las áreas estratégicas del PGM. Asimismo, se discutió sobre la importancia de conformar el Consejo Local (COLAC) de la ZPCE, como el mecanismo de participación adecuado una vez concluido este proceso. Se brindó una semana de tiempo post taller para que los actores enviaran sus observaciones a las líneas de acción.

Finalmente, se analizan e incorporan los aportes de los actores a las líneas y programas del Plan de Manejo.

Empoderamiento comunal

Un aspecto de gran relevancia en esta etapa, es el surgimiento de grupos de discusión comunal, que nacen con el objetivo de analizar más en detalle los productos generados durante el proceso. Un ejemplo de esto es la conformación del "**Foro Ciudadano por la protección el desarrollo de la ZPCE"** integrado por Asociaciones, propietarios, Instituciones, ect; que tuvieron un papel fundamental aportando insumos a los documentos técnicos generados.

Etapa 5. Construcción de la Zonificación

Esta etapa da inicio en julio 2015, una vez se concluye el estudio de suelos de la ZPCE a cargo del INTA (MAG), el cual abarcó un amplio y complejo trabajo de campo (muestreos) y análisis de información, por lo que requirió más tiempo del que se había previsto. Los datos de capacidad de uso de la tierra generados en este estudio fueron fundamentales para elaborar la zonificación.

En una de las sesiones con el Comité de Seguimiento se definieron las capas necesarias para generar el mapa de zonificación, estas por acuerdo unánime fueron:

Tomando como base estas capas, Fundación Neotrópica generó una propuesta de zonificación y la presentó ante el Comité de Seguimiento (CS). Posteriormente, analizó e incorporó cada una de las observaciones realizadas por el CS a la propuesta.

También, se sostuvieron reuniones específicas con ACOPAC, para definir más en detalle aspectos técnicos y legales de la zonificación.

Es así como, una vez aprobada la propuesta de zonificación por el CS, se llevaron a cabo en agosto y setiembre 2015, los talleres de "Presentación de la Zonificación de la ZPCE", teniendo como objetivo presentar la propuesta de zonificación y recibir retroalimentación por parte de los asistentes. En este taller se le entrega a cada participante una copia del detalle de la propuesta de zonificación y el mapa correspondiente. En total asistieron 62 personas.

"Es importante integrar el tema del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú dentro del eje ambiental del CCI (Comité Cantonal Interinstitucional)"

Taller de presentación de la Zonificación, Municipalidad de Aserrí

De manera general, los participantes conocieron el detalle de la zonificación propuesta y el respaldo legal y técnico que se utilizó para su elaboración. Asimismo, se acordó que Fundación Neotropica recibiría comentarios y aportes a la propuesta de zonificación hasta el 09 de septiembre 2015. A partir de este momento, se inicia un proceso de recepción de documentos generados por los actores. El *"Foro ciudadano por la protección y el desarrollo de la ZPCE"* entregó un documento con excelentes insumos, donde se destacan observaciones puntuales con respaldo legal y técnico. A su vez, diferentes propietarios a nivel individual hicieron llegar sus observaciones a las oficinas de Neotrópica.

Fundación Neotrópica procedió a analizar y considerar cada una de las observaciones y comentarios enviados por los actores, con el objetivo de valorar la manera en que podían ser incorporados a la zonificación según la legislación vigente. Esto fue analizado en conjunto con el Comité de Seguimiento. Asimismo, se envió las respuestas a las personas o grupos que enviaron consultas y comentarios.

Un factor clave en esta etapa fue el acercamiento con los actores y la transparencia con que se manejó la información. Cada insumo recibido fue tomado en cuenta y analizado junto con ellos. La zonificación fue construida en CONJUNTO.

Etapa 6. Validación del Plan de Manejo e inicio del proceso de oficialización

Fundación Neotrópica, elaboró el primer borrador de Plan de Manejo en setiembre 2015, y lo presentó al Comité de Seguimiento (CS) para su revisión. Una vez, aprobado por el CS; se envió a los actores para su análisis previo. El *Foro ciudadano por la protección y el desarrollo de la ZPCE*, envío un documento con el análisis de la propuesta de Plan de Manejo.

En octubre 2015 se llevaron a cabo los talleres de "Presentación del Plan de Manejo de la ZPCE" que permitieron presentar y validar el documento de Plan de Manejo (PM) y recibir retroalimentación por parte de los participantes. A su vez, se logró aclarar todas las dudas de los asistentes con respecto al proceso que se ha llevado a cabo, y se orientó sobre el proceso que sigue una vez aprobado y oficializado el PM. Se brindó una semana de tiempo post taller para que los actores enviaran sus observaciones. Asistieron en total 75 personas.

Fundación Neotrópica, elaboró una versión de Plan de Manejo donde incorpora las observaciones e insumos de los talleres y documentación presentada por diferentes actores en el proceso de validación y consulta. Esta versión se socializa con el Comité de Seguimiento, Comité Técnico Científico ACOPAC, Departamento Legal ACOPAC y CORAC-ACOPAC para su revisión y aprobación.

Como parte del acompañamiento en la oficialización del Plan de Manejo, Fundación Neotrópica presentó en una sesión extraordinaria de CORAC-ACOPAC, en octubre 2015, el proceso participativo que se llevó a cabo para la elaboración del PM, asimismo explicó el papel que desempeña el CORAC en la oficialización del plan.

Finalmente, Fundación Neotrópica elabora una propuesta de Reglamento de uso público de la ZPCE, así como el acta de declaración del Concejo Local de la ZPCE, para revisión y aprobación por parte del Comité de Seguimiento.

Estrategias transversales al proceso

Durante la elaboración del PM de la ZPCE se llevaron a cabo dos estrategias transversales que fueron claves para el buen desarrollo de este proceso.

Estrategia de comunicación e información: Se desarrolló una herramienta breve para sondear el uso de medios de comunicación y otros aspectos por parte de las y los participantes, la cual se aplicó de manera escrita en el primer taller y con base en la cual se plantean las acciones estratégicas. De manera general, se utilizaron diferentes medios de comunicación que permitieron informar sobre el proceso, entre ellos se destacan:

- ✓ Boletines informativos impresos y digitales con temas de interés que surgían en los talleres.
- ✓ Facebook "Plan de Manejo Cerros de Escazú´". Medio para comunicar información de los talleres y mantener un registro fotográfico del proceso.
- ✓ Cuñas de radio en diferentes emisoras locales y nacionales
- ✓ Página web de Fundación Neotrópica, donde se encuentra el detalle del proyecto y se pueden descargar las memorias de los talleres y los boletines informativos.
- ✓ Publicación en la revista " Gente Verde"

Estrategia de resolución de conflictos: sirvió como guía para la aplicación de estrategias apropiadas a los problemas que generan la conflictividad ambiental en la ZPCE, logrando evitar una evitar una escalada en el nivel de conflictividad. Para esto se plantea que el camino para el diseño del proceso del Plan de Manejo se caracterice por:

- ✓ Los actores identificados e involucrados en el proceso participan de forma activa y con un grado de confianza suficiente para que el desarrollo de este proceso se realice en el plazo requerido.
- ✓ Se propone la promoción de espacios de participación como talleres y reuniones, así como la posterior creación del Concejo Local de la ZPCE, el cual permita que los diferentes actores relacionados con la Zona Protectora cuenten con un espacio para la gestión de los recursos de forma concertada.
- ✓ La creación de la zonificación debe no ser sólo ser participativa sino que debe alcanzar un balance entre los aspectos técnicos y legales que son requeridos, la naturaleza y estado actual de los recursos y los derechos que da nuestra legislación a los diferentes tipos de propiedad y grupos culturales que se encuentran dentro del área protegida.
- ✓ Todo este proceso se recomienda enmarcarlo en una estrategia de comunicación.

3. Lecciones aprendidas

- Se debe contar con un código de ética a lo interno del Comité de Seguimiento que defina como será el manejo de información durante todo el proceso, esto con el fin de evitar conflictos colaterales.
- En estos procesos es fundamental contar con un manejo adecuado de la información a nivel interno del Área de Conservación correspondiente, ya que de lo contrario no se cuenta con documentos consensuados a nivel de área.
- Se hace necesario que el Área de Conservación nombre a un funcionario responsable del proceso de Plan de Manejo.
- Contar con una estrategia de comunicación es fundamental ya que define los mejores medios para mantener informados a los actores.
- La transparencia es indispensable para el éxito de este tipo de procesos. Facilitar información clara y concisa a los actores que la soliciten.
- Sostener reuniones particulares con actores claves del proceso, resulta fundamental; y mantener al tanto al Comité de Seguimiento sobre lo discutido en estas reuniones.

Retos para la implementación del Plan General de Manejo de la ZPCE

- Coordinación institucional (ACOPAC- Municipalidades) para la implementación del Plan de Manejo.
- Coordinación del sector productivo, comunal, propietarios, ONG e instituciones para la implementación del Plan de Manejo
- Capacidad técnica de ACOPAC para atender la demanda de trámites e inspecciones que soliciten los propietarios, en el momento que se apruebe el Plan de Manejo.
- Asignación de funcionarios en ACOPAC para implementar el PGM
- Reestructuración de las áreas de conservación del SINAC
- Conformación del Consejo Local de la ZPCE como ente participativo fundamental.
- En el diagnóstico quedaron algunos vacíos de información, ya que parte de la información requerida aún no ha sido generada por ninguna entidad, o bien, se requieren recursos financieros para la realización de estudios de alto costo; por ejemplo un inventario completo de las nacientes y pozos ubicados dentro de la ZPCE. En la fase de implementación del PGM será necesario compilar o generar más información sobre el recurso hídrico, y tenencia de la tierra.

4. Registros de reuniones

4.1 Minutas-Comité de Seguimiento

Minuta 1

Reunión introductoria del proyecto: Elaboración del Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
08 de octubre, 2014

1. **Participantes:** Leonardo García (Costa Rica por Siempre), Bernardo Aguilar (Director Fundación Neotrópica), Marco Vinicio Araya (Secretaria Ejecutiva-SINAC), Sergio Vargas (ACOPAC), Alfonso Duarte (Director ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), Johan Aguilar (ACOPAC), Efraín Monge (ACOPAC), Francisco Jiménez (ACOPAC), Ligia Guzmán (Municipalidad de Puriscal), Fulvia Wolh (ACOPAC), Grettel Agüero (Municipalidad de Mora), Helmut Johnson (Municipalidad de Santa Ana), Carlomagno Salazar (INTA), Carole Brun (Fundación Neotrópica), Adriana Fernández (Fundación Neotrópica), Lorena Erbure (Fundación Neotrópica), Alexander González (Fundación Neotrópica)
2. Lugar: Oficinas Asociación Costa Rica por Siempre
3. Motivo de la reunión: Presentar y discutir el proceso a seguir para dar inicio a la ejecución del proyecto "Elaboración del Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú".
4. Duración de la reunión: 3 horas.
Acuerdos 1. El Comité de Seguimiento del Proyecto: "Elaboración del Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú" estará conformado por: - Andrea Montero (Asociación Costa Rica por Siempre) - Marco Vinicio Araya (Secretaría Ejecutiva-SINAC) - *Grettel Agüero Alfaro (Represente de las municipalidades) - *Helmut Johnson (Represente de las municipalidades) - Gerardo Chavarría Amador (ACOPAC) - Efraín Monge Hernández (ACOPAC) (*) Se debe emitir una notificación donde las Municipalidades de Alajuelita, Acosta, Aserrí, Mora, Santa Ana y Escazú muestren su acuerdo en que Grettel Agüero y Helmut Johnson sean sus representantes en el Comité de Seguimiento del proyecto. 2. Se define la fecha de la próxima sesión de trabajo que tendrá como fin definir los Elementos Focales de Manejo, usos y amenazas sobre estos, y mapeo de actores por parte del Comité de Seguimiento: Fecha: 7 noviembre Hora: 2pm Lugar: EMAI, Santa Ana (está pendiente el envío de la dirección exacta por parte de Helmut Johnson). 3. Fundación Neotrópica le hará llegar a las municipalidades, ACOPAC, INTA, y otras instituciones una solicitud con la información que requiere para la definición de los EFM y la elaboración de los diagnósticos.

ASOCIACIÓN COSTA RICA POR SIEMPRE

SINAC SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN COSTA RICA

ÁREA DE CONSERVACIÓN PACÍFICO CENTRAL ACOPAC - MINAE

II CANJE POR NATURALEZA KFW - GIZ

Actividad: Reunión Introductoria Cerros de Escazú y Tivives

Fecha: 08 de octubre, 2014

Lugar: Oficinas ACRXS

	Institución	Nombre	Puesto	Teléfono	Correo	Firma
1	ACRXS	Leonardo Garcia	Ofic. Conserv.	22047350	lgarcia@acrxs.org	
2	Neotrópica	Bernardo Aguilar	Director Ejecutivo	22532130		
3	SINAC-DCRXS-SE	Marco V. Angulo	Coordinador RCRXS	22050		
4	SINAC-Acopac OSR	M. Sergio Naranjo	Técnico,	24166576	sarago38@gmail.com	Sergio Naranjo
5	SINAC-ACOPAC	Alfonso Duarte	DIRECTOR	87091085	alfonso.duarte@sinac.go.cr	
6	SINAC-ACOPAC	Gerardo Chaverri	ASS	83093432	gerardo.chaverri@sinac.go.cr	
7	SINAC - ACOPAC	Johan Aguilar F.	Encargado Z. P. Tivives	86022504	johan.aguilar@sinac.go.cr	
8	ACOPAC-OSR P	Gisela Monge Hdez.	Jefe. OSR P	24167878	oficina.monge@hotmail.com	
9	ACOPAC-UT	Francisco Jimenez Quiros	Encargado Unid. Tec	24162068 ext 125	francisco.jimenez@sinac.go.cr	
10	Mun. Puntarenas	Hugo Guzmán Madrigal	Gestor Ambiental Municipal	24610646	hguzmanm24@hotmail.com	
11	Sinac - Acopac	Silvia Vidal Jiménez	Coord. Conservacion	2416-7068	silvia.vidal@sinac.go.cr	
12	Muni Mora	Gretel Aguero A.	Gestora Ambiental	87026534	gestionambiental@mora.go.cr	
13	Helmut Johnson M.	Muni. Santa Ana	Contralor Ambiental	8316-3712	hjohnson@santana.go.cr	
14	INTA	Carlos Magno Salazar	C- Investigador	88-21-04-18	csalazar@inta.go.cr	
15	Fundación Neotrópica	Carlos Perun	Encargado Apoyo técnico	22538130	cperun@neotropica.org	
16	Fundación Neotrópica	Adriana Fernández	Asistente técnica	2253-21-30	afernandez@neotropica.org	
17	Fund. Neotrópica	Lorena Echeverría	Coord. Unid. Análisis	2253-2130	lecheverria@neotropica.org	
18	Fund Neotropica	Alexander González	Apoyo Técnico	2253-2130	agonzalez@neotropica.org	
19	ACR x S	Andrea Montero C.	Ofic. Conserv. Marina	2204-7350	amontero@acrxs.org	
20						

Minuta 2

Elaboración del Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
07 de noviembre, 2014

1. **Participantes:** Gerardo Chavarría (ACOPAC), Efraín Monge (ACOPAC), Alex Méndez Arias (ACOPAC), Helmut Johnson (Municipalidad de Santa Ana), Lorena Erbure (Fundación Neotrópica), Alexander González (Fundación Neotrópica), Andrea Montero (ACRxS).

2. Lugar: Escuela Municipal de Artes Integrales de la Municipalidad de Santa Ana

3. Motivo de la reunión: definir los Elementos Focales de Manejo, usos y amenazas sobre estos, y mapeo de actores por parte del Comité de Seguimiento.

4. Inicio y duración de la reunión: 2pm, 2:30 horas.

Acuerdos

1. Se acuerda que la FN participará de la reunión quincenal del ***equipo técnico ambienta***l de las municipalidades vinculadas con el ASP-ZPCE, con la intención de solicitarles la información requerida a cada una de ellas. El lunes 17 de noviembre sería la próxima reunión. Acordamos que Helmut coordinará que se incluya en la agenda de este equipo técnico un espacio para la presentación de la FN, la reunión será en ACOPAC.
2. Información del régimen climático incluyendo microclimas en la zona y potenciales riesgos de eventuales cambios climáticos. Se le solicitará al Instituto Meteorológico Nacional.
3. Estudios de la Comisión Nacional de emergencias sobre pendientes elevadas y otros factores relevantes se les solicitará directamente a las municipalidades.
4. Mapa de los propietarios y los títulos legales de los usuarios de las tierras se solicitarán a las municipalidades. Así como la base de datos con información actualizada de las fincas ubicadas en la ZPCE.
5. De ACOPAC Efraín pasará los datos financieros que se tienen en cuanto a viáticos, tiempos, visados, PSA, etc. que se invierten en relación a la ZPCE y que sirven de apoyo para el análisis financiero del AP.
6. ACOPAC solicitará a FONAFIFO si tiene información sobre la ZPCE con respecto a cobertura boscosa.
7. ACOPAC aportará fotos aéreas de 2013.
8. ACOPAC enviará información de tesis que se han hecho en la zona.
9. Fundación Neotrópica visitará las oficinas de ACOPAC en Puriscal para obtener la siguiente información: estudios referentes al estado de conservación, integridad ecológica y viabilidad ecológica del ASP, Información de amenazas (usos y presiones) sobre el ASP, Denuncias que se presentan dentro del ASP, Mapa de usos actuales del terreno, Capacidad de uso del suelo y distribución de la cobertura boscosa; Identificación de los pozos existentes y volúmenes utilizados; toda la información SIG que tenga ACOPAC con respecto a la ZPCE. Fundación Neotrópica enviará un correo indicando día y hora en el que estarán visitando las dependencias de ACOPAC.

Entrega de Productos por parte de FN:

- Se acuerda entregar el primer producto para mediados de enero. FN presentará carta de solicitud de ampliación del plazo a CRxS. A finales de enero se tendrá la programación de los talleres de presentación en las comunidades.
- 16 de enero: entrega del primer producto
- 30 enero: entrega de comentarios al producto del CS a FN
- 6 febrero: taller de presentación con las comunidades
- Hacer la convocatoria tres semanas antes de la fecha del taller
- Acuerdo para convocatoria: ACOPAC suministrará lista de actores a FN para conocer con anticipación quiénes participarán.

Se establece la próxima reunión: 25 noviembre, 9am CRxS para definición de EFM a través de una propuesta preliminar elaborada por FN. En dicha reunión FN deberá traer la lista de participantes para firma y machote para legitimación de actores o representantes en el proceso.

Reunión Comité de Seguimiento Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Viernes 7 de noviembre 2014
Lugar: Municipalidad Santa Ana

Lista de Asistencia

Nombre	Institución	Teléfono	Correo	Firma
Alex Quesada Sojo	ACOPAC MINAE	6040 22-05 2416-78-78	Alex.Mendez32@hotmail	
Helmut Johnson	Muni Santa Ana	2682-7412 8316-3712	hjohnson@escazumagico	
Andrea Montero C.	Asoc. CR x S.	2204-7351	amontero@costaricaforsiempre.org	Andrea Montero C.
Irene Esbelo Cordero	Fund. Neotrópica	2253-2130	iesbelo@neotropica.org	

Minuta 3

Reunión del Comité de Seguimiento
Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Viernes 06 de febrero, 2015

1. **Participantes:** Marco Vinicio Araya (Costa Rica por Siempre-SINAC), Sergio Vargas (ACOPAC), Alex Méndez (ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), Helmut Johnson (Municipalidad de Santa Ana), Andrea Montero (Asociación Costa Rica por Siempre), Adriana Fernández (Fundación Neotrópica), Lorena Erbure (Fundación Neotrópica)

2. Lugar: Oficinas Biomarcc San José

3. Motivo de la reunión: Reunión de Comité de Seguimiento

4. Duración de la reunión: 3 horas.

Acuerdos

1. Los talleres de presentación del proyecto quedan de la siguiente manera:

- Sector Escazú, Mora y Santa Ana: Viernes 27 de febrero en Santa Ana. Para este grupo se calculan un total de 50 personas. Convocatoria comienza 9 de febrero (duración 2 semanas).
- Sector Acosta: Viernes 6 de marzo en Acosta. Se calcula un total de 40 personas. Convocatoria comienza 16 de febrero (duración 2 semanas).
- Sector Alajuelita y Aserrí: Viernes 13 de marzo en Aserrí. Se calcula un total de 40 personas. Convocatoria comienza 23 de febrero (duración 2 semanas).
- Los talleres iniciarán a las 9 AM
- Se buscará realizarlos en los Gimnasios de los Colegios/Escuelas de las comunidades con el fin de contar con bastante espacio.

2. Helmut brindará apoyo a la Fundación Neotrópica en la búsqueda del lugar para llevar a cabo el taller en Santa Ana.
3. Fundación Neotrópica enviará machote de la invitación al taller a ACOPAC, el cual se encargará de colocar a quien va dirigida cada invitación.
4. La entrega de las invitaciones personalmente se hará con un representante de ACOPAC y de Fundación Neotrópica. El miércoles 11 de febrero se repartirá las invitaciones para el taller de Santa Ana, previa coordinación de ambas partes.
5. Las invitaciones vía correo electrónico saldrán del correo del Director de ACOPAC firmadas por Bernardo Aguilar (Fundación Neotrópica) y Alfonso Duarte (ACOPAC). Este correo debe ir con copia a Lorena Erbure de Fundación Neotrópica.
6. Gerardo facilitará a la Fundación Neotrópica el listado de los actores a invitar con los números de teléfono.
7. ACOPAC entregará las invitaciones personalmente en Acosta y consultará las opciones del lugar para efectuar el taller.
8. Fundación Neotrópica entregará el borrador del diagnóstico el 06 de marzo.
9. Fundación Neotrópica enviará el borrador con los últimos cambios indicados el día de hoy sobre la caracterización de los EFM (recurso hídrico, paisaje y ruralidad) en la semana del 09 de febrero para su validación.
10. Alex de ACOPAC, entregará la solicitud de información de catastro a la Municipalidad de Acosta personalmente.

FUNDACION NEOTROPICA | II CANJE POR NATURALEZA EEUU - CR | ASOCIACION COSTA RICA POR SIEMPRE | AREA DE CONSERVACION PACIFICO CENTRAL ACOPAC - MINAE | SINAC COSTA RICA

Reunión Comité de Seguimiento Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Viernes 5 de febrero, 2015
Lugar: Oficinas Centrales SINAC

Lista de Asistencia

Nombre	Institución	Teléfono	Correo	Firma
Sergio Vargas Gómez	OSRP SINAC - ACOPAC	Ext. 113 2416 65 76	Sergio.Vargas@sinac.go.cr	Sergio Vargas G.
Ana Wendy Sáenz	OSRP SINAC - ACOPAC	6040 22 05	ana.wendy@sinac.go.cr	Ana Wendy Sáenz
Gerardo Chaverri	SINAC - ACOPAC	83-05-34-32	gerardo.chaverri@sinac.go.cr	
Marco V. Mayorga	SINAC - PCRES	88298671	marco.mayorga@sinac.go	
Helmut Johnson M.	Muni. Santo Ana	8316-3712	hjohnson@santoana.go.cr	
Andrea Montero C.	ASOC. CRES	2204-7351	amontero@costaricaporsiempre.org	Andrea Montero C.

Minuta 4

Reunión del Comité de Seguimiento
Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Viernes 20 de febrero, 2015

2. **Participantes:** Alfonso Duarte (ACOPAC), Marco Vinicio Araya (Costa Rica por Siempre-SINAC), Sergio Vargas (ACOPAC), Alex Méndez (ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), Helmut Johnson (Municipalidad de Santa Ana), Andrea Montero (Asociación Costa Rica por Siempre), Pamela Castillo (Asociación Costa Rica por Siempre), Adriana Fernández (Fundación Neotrópica), Lorena Erbure (Fundación Neotrópica), Grettel Agüero (Municipalidad de Mora), Efraín Monge (ACOPAC)

2. Lugar: Oficinas SINAC San José

3. Motivo de la reunión: Reunión Comité de Seguimiento para ver detalles de la metodología taller de presentación del proyecto

4. Duración de la reunión: 3 horas.

Lorena Erbure presenta los puntos analizar en el taller:

1. Inquietudes de la reunión con los Alcaldes de Cerro de Escazú
2. Agenda y metodología del taller de presentación del proyecto (Taller Santa Ana)

Acuerdos

1. Fundación Neotropica preparará borrador de oficio en respuesta a las inquietudes de los alcaldes con el detalle de los avances del proceso (Estudio de CDG, términos de referencia, acreditación a la Fundación Neotrópica, conformación del Comité de Seguimiento, avances del diagnóstico, estudio de suelos que está ejecutando el INTA en conjunto con ACOPAC, definición de la propuesta de Elementos Focales de Manejo, convocatorias a talleres de presentación del proyecto) y pasos a seguir. Asimismo, se debe Indicar que falta para completar el diagnostico con indicación de responsables; este oficio lo circulará al comité para revisión y posterior firma y envío por parte de ACOPAC a todos los participantes de la reunión.
2. Alfonso enviará el oficio a Julio Jurado y Patricia Madrigal y les extenderá la invitación al Taller del viernes 27 de febrero en Santa Ana.
3. ACOPAC (Alfonso y Gerardo) contactarán a Julio Jurado para ver su disponibilidad para dar la bienvenida al taller.
4. ACOPAC (Alfonso y Gerardo) prepararán las diapositivas que les corresponde y definirán quien es el expositor. Esta información debe ser enviada a Lorena para que lo incorpore a la presentación final el miércoles 25 de febrero.
5. Fundación Neotrópica preparará Comunicado/boletín (comunicado #1) con antecedentes y avances para repartir a actores en el taller, para revisión previa por el Comité de Seguimiento
6. Fundación Neotrópica (Lorena) enviará el miércoles 25 de febrero presentación del taller de previo con el Comité de seguimiento
7. ACOPAC (Gerardo Chavarría) manejará el expediente administrativo del proceso de elaboración del Plan de Manejo actualizado y disponible para consulta pública.
8. Gerardo Chavarría enviará invitaciones a representantes del CONAC.
9. Fundación Neotrópica hará la consulta a Marco Vinicio para que nos apoye como Moderador en el taller de Santa Ana, dado que Karla Córdoba de Fundación Neotrópica no puede asistir.

Reunión Comité de Seguimiento Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Viernes 20 de febrero, 2015
Lugar: Oficinas Centrales SINAC

Lista de Asistencia

Nombre	Institución	Teléfono	Correo	Firma
Andrea Montero C.	Asoc. CRxS	2204-7350	amontero@costaricaporsiempre.org	
Pamela Castillo	ERYJ	2204730	pcastillo@costaricaporsiempre.org	
Alfonso Duarte M	ACOPAC	87091085	alfonso.duarte@sinac.go.cr	
Marco V. Mora	FONAFIFO	88298671	marco.vinicio.mora@fonafifo.com	
Helmyt Johnson	Muni. Santa Ana	8316-3712	hjohnson@santaana	
Gretel Azofeifa	Muni Mora	87026534	gestionambiental@mora.go.cr	
Geovanny Chaverri	ACOPAC	8309 3432	geovanny.chaverria@sinac.go.cr	
Alex Mejías Sanz	ACOPAC	60402205	alex.mejias@sinac.go.cr	
Efraín Monge Hdez	ACOPAC-OSRP	2416 7878	efrain.monge@sinac.go.cr	
Lorena Erbure Cordero	Fund. Neotropica	8330-4082	lerbure@neotropica.org	

Activar \
Ir a Config

Minuta 5

Reunión situación actual de los proyectos
Miércoles 18 de marzo, 2015

3. **Participantes:** Gerardo Chavarría (ACOPAC), Andrea Montero (Costa Rica por Siempre), Pamela Castillo (Costa Rica por Siempre), Marcia Carranza, Adriana Fernández y Marco Hidalgo (Fundación Neotrópica)
2. Lugar: Oficinas Costa Rica por Siempre
3. Motivo de la reunión: Analizar la situación actual de los proyectos y definir los nuevos plazos para la entrega de productos.
4. Inicio y duración de la reunión: 2:00 PM 1 Hora
Acuerdos 1. CDG entregará el insumo sobre caracterización de tenencia de tierra el 25 de marzo y será enviado al Comité de Seguimiento 2. La convocatoria para procesos de ACOPAC se hace previo a Semana Santa 3. La propuesta de zonificación se presentará como parte del producto 2 4. Fundación Neotrópica enviará a ACOPAC y Costa Rica por Siempre un cronograma con la propuesta de fechas de los próximos talleres de Cerros de Escazú, así como de las reuniones con el Comité de Seguimiento, convocatoria y entrega de productos. 5. Se fusionará el taller de zonificación con el de líneas de acción 6. Fundación Neotrópica enviará a ACOPAC machote de invitación para los próximos talleres para su aprobación y envío.

Minuta 6

Reunión del Comité de Seguimiento
Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Lunes 20 de abril, 2015

4. **Participantes:** Alex Méndez (ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), Helmut Johnson (Municipalidad de Santa Ana), Andrea Montero (Asociación Costa Rica por Siempre), Marco Hidalgo (Fundación Neotrópica) Adriana Fernández (Fundación Neotrópica), Marcia Carranza (Fundación Neotrópica), Grettel Agüero (Municipalidad de Mora), Francisco Jiménez (ACOPAC)

2. Lugar: Oficinas Costa Rica por Siempre

3. Motivo de la reunión: Reunión Comité de Seguimiento para ver detalles de la metodología del taller de validación del diagnóstico y los Elementos Focales de Manejo; y ver las correcciones realizadas la diagnostico socioambiental.

4. Duración de la reunión: 3 horas.

Acuerdos

1. A las invitaciones del taller se le adjuntará machote de carta para nombrar a los representantes de cada organización (mínimo 10 integrantes). Fundación Neotrópica enviará ambos formatos a ACOPAC.
2. El día del taller se tendrá impreso el machote de carta para nombrar representantes, en caso de que no fueran asignados antes. Este día tiene que quedar nombrados todos los representantes.
3. Fundación Neotrópica enviará lista de invitados al taller a ACOPAC para que se inicie con la convocatoria (se hará con base en las listas de asistencia de los talleres anteriores y los actores identificados en el mapeo de actores)
4. Fundación Neotropica confirmará el lugar del taller para Santa Ana
5. Gerardo enviará el documento “Informe- auditoria de las Áreas Silvestres Protegidas” a Fundación Neotrópica, para que sirva de insumo para el diagnóstico.
6. Dar seguimiento al estudio de suelos del INTA, definir fecha de entrega. (ACOPAC)
7. Gerardo enviará “mapa de fallas y vertientes” correspondiente a la ZPCE a la Fundación Neotrópica.
8. Fundación Neotrópica enviará al Comité de Seguimiento tabla en Excel con las amenazas identificadas por Elemento Focal de Manejo, para que puedan ser priorizadas.
9. Gerardo y Grettel presentarán al CORAC un estado del avance del Plan de Manejo (lo que se ha hecho hasta el momento; y que es lo que sigue); esto en el mes de Mayo.
10. Se enviará al CORAC el diagnostico una vez esté validado por el Comité de Seguimiento y por las comunidades.

Actividad:	**Reunión de Comité de Seguimiento**
Proyecto:	**Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú**
Lugar:	Asociación Costa Rica por Siempre
Fecha:	20/04/2015

Nombre	Institución	Contacto	Firma
Francisco Jiménez Quirós	ACOPAC-SINAC	francisco.jimenez@sinac.go.cr	
Alex Murillo Soto	ACOPAC-SINAC	alex.murillo@sinac.go.cr	
Gerardo Chaverri A.	ASOPOC-SINAC	gerardo.chaverri@sinac.go.cr	
Marco Hidalgo Chaverri	Fundación Neotropica	mhidalgo@neotropica.org	
Grettel Aguirre Alfaro	Muni Mora	gestionambiental@mora.go.cr	
Helmut Johnson M.	Muni Santa Ana	hjohnson@santaana.go.cr	
Andrea Montero Cordero	Asociación CR×S	amontero@costaricaporsiempre.org	Andrea Montero C.
Adriana Fernández S.	Fundación Neotropica	afernandez@neotropica.org	
Marcia Carranza V	Fundación Neotropica	mcarranza@neotropica.org	

Minuta 7

Minuta de Actividad
Reunión de Coordinación con el Comité de Seguimiento Plan General de Manejo Zona Protectora Cerros de Escazú – Zonificación y Líneas de acción
13 Mayo 2015

Participantes: Helmuth Johnson, Alex Méndez, Marco Hidalgo, Adriana Fernández, Francisco Jiménez, Efraín Monge, Andrea Montero, Marco Vinicio Araya, Marcia Carranza.
Lugar: Oficinas ACRxS
Motivo: Mesa de trabajo Zonificación Zona Protectora Cerros de Escazú
Duración de la Reunión: 4 horas

Acuerdos

1. Solicitar participación de C. N. E. en talleres de zonificación (Fundación Neotrópica).
2. Seguimiento a solicitud de información de Carlo Magno a ACOPAC – Meteorológico (Fundación Neotrópica – ACOPAC Francisco llama a Fulvia)
3. Visita a C. N. E. para solicitud de shapes sobre deslizamientos y zonas de emergencia en ZPCE (Fundación Neotrópica – Alex ACOPAC).
4. FONAFIFO: Alex Calvo 8855 – 5400. Para explicar los incentivos y planificación. Se puede incluir en los programas del Plan de Manejo.
5. Solicitar una nota a FONAFIFO con consulta de si el mapa del 2012 es oficial (decreto 36818 – MINAET oficialización de los mapa de cobertura
6. Dividir zonificación y líneas de acción (en caso de ser necesario)
7. Tomar en cuenta en la zonificación

- Capa de comisión de emergencias
- Capa de pozos y nacientes (contar con la presencia de algún experto de la dirección de aguas o similar en el taller)
- Capa de bosque (Adriana llama a FONAFIFO para consultar si el mapa de 2012 es el oficial)
- Pendientes

Actividad:	Reunión de Comité de Seguimiento
Proyecto:	**Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú**
Lugar:	Asociación Costa Rica por Siempre
Fecha:	13/05/2015
Objetivo	Metodología taller de zonificación y líneas estratégicas

Nombre	Institución	Contacto	Firma
Helmut Johnson M.	Muni. Santa Ana	2582-7412 hjohnson@santaana.go.cr	
Alex Brenes Sáenz	SINAC-ACOPAC	alex.brenes@sinac.go.cr	
Marco Hidalgo Chaverri	Fundación Neotropica	mhidalgo@neotropica.org	
Adriana Fernández	Fundacion Neotropica	afernandez@neotropica.org	
Francisco Jiménez Quirós	A-COPAC-UT	francisco.jimenez@SINAC.go.cr	
Efraín Mongo Hdez	ACOPAC-OSRP	efrain.mongo@sinac.go.cr	
Andrea Montero C.	ASOC. CR×S	amontero@costaricaporsiempre.org	
Marco A. Arroyo P.	SINAC-PCRES	marco.arroyo@sinac.go.cr	
Marcia Carranza Vargas	Fundación Neotropica	2253-2130 / 8349-5468 mcarranza@neotropica.org	

Minuta 8

Reunión del Comité de Seguimiento
Proyecto: Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Martes 26 de mayo, 2015

5. **Participantes:** Andrea Montero (Asociación Costa Rica por Siempre), Adriana Fernández (Fundación Neotrópica), Marco Hidalgo (Fundación Neotrópica), Sergio Vargas (ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), Helmut Johnson (Municipalidad de Santa Ana) Alex Mendez (ACOPAC)

2. Lugar: Fundación Neotrópica

3. Motivo de la reunión: Reunión Comité de Seguimiento

4. Duración de la reunión: 2 horas.

Acuerdos

1. Se acuerda utilizar el mapa oficial de FONAFIFO 2000 con modificación 2005 (según decreto)
2. Se decide que se va utilizar el SHP con los límites de la ZPCE que se ha venido utilizando, en vista de que no existe variación con lo estipulado en el decreto. Las variaciones que pueden existir responden a un error de proyección de Lambert a CRTM05
3. En vista de que los IFAS no están completos para toda la ZP se decide no utilizarlos.
4. Se acuerda no cancelar los talleres de "zonificación y líneas de acción" (falta información para generar la zonificación) con el fin de evitar una actitud negativa. Este taller abarcará solo "líneas de acción" y más adelante se hará un taller exclusivo para "zonificación".

Proyecto Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Lista de Asistencia

Reunión del Comité de Seguimiento
Fecha: Martes 26 de mayo de 2015
Hora de Inicio: 9am
Lugar: Fundación Neotrópica

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Sergio Vargas G.	SINAC-ACOPAC.	C. 50091615. 24166576	sergio.vargas@sinac.go.cr
Gerardo Chaverri	SINAC. ACOPAC	83093432	gerardo.chaverri@sinac.go.cr
Andrea Montero C.	Asociación CR y S	2204-7351	amontero@costaricaporsiempre.org
Helmut Johnson M.	Muni. Santa Ana	~~2203-7746~~ 2582-7412	hjohnson@santaana.go.cr
Marco Hidalgo Chaverri	Fundación Neotropica.	2253-2031	mhidalgo@neotropica.org.
Ana Lucía Soto	SINAC-ACOPAC	60402205	ana.lucia@sinac.go.cr
Adriana Fernández	Fundacion Neotropica	8544-7227	afernandez@neotropica.org

Minuta 9

Reunión del Comité de Seguimiento
Proyecto: Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Lunes 17 de agosto, 2015

6. **Participantes:** Alfonso Duarte (ACOPAC, Sergio Vargas (ACOPAC), Alex Méndez (ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), Helmut Johnson (Municipalidad de Santa Ana), Andrea Montero (Asociación Costa Rica por Siempre), Adriana Fernández (Fundación Neotrópica), Marco Hidalgo (Fundación Neotrópica), Grettel Agüero (Municipalidad de Mora).

2. Lugar: ACOPAC- Puriscal

3. Motivo de la reunión: Reunión Comité de Seguimiento para ver la zonificación y detalles finales del diagnóstico.

4. Duración de la reunión: 4 horas.

Acuerdos

1. Las reuniones que se soliciten directamente a miembros del Comité de Seguimiento (CS), no se realizarán a menos que esté presente un representante de ACOPAC, miembro de este comité. Adicionalmente, ACOPAC informará al Comité de Seguimiento sobre las reuniones que se les soliciten para estar todos enterados de lo que está pasando y las inquietudes de los actores clave, y así evitar que los actores manejen información equivocada.
2. Con respecto a las fechas de entrega, ACOPAC no solicitará ninguna extensión de plazo a la Contraloría, por lo que se espera que Neotrópica cumpla con la entrega de productos finales. Las fechas que deben cumplirse son:

- 18 agosto: FN entrega Diagnóstico corregido y con incorporaciones de actores clave y Comité de Seguimiento.
- 21 agosto: Es la fecha límite que el CS da a FN para que entregue los mapas de zonificación
- 25 agosto: CS responde a FN sobre aprobación de producto del Diagnostico Socio ambiental
- 26 agosto: reunión interna de zonificación para CS. Deben estar los mapas listos de Diagnóstico y zonificación, esto por parte de Fundación Neotrópica
- 28 agosto: Taller de zonificación en Aserrí y Acosta (En la mañana 9AM, taller en Aserrí y a las 2PM taller en Acosta, ambos en las Municipalidades correspondientes)
- 01 setiembre: Taller de Zonificación en Santa Ana, 9AM, lugar por definir.
- 8 setiembre: FN entrega la primera versión del Plan de Manejo (secciones completas) al CS.
- 11 setiembre: CS responde con correcciones o aprobación del documento del Plan de Manejo, a más tardar 12 md.
- 16 setiembre: FN entrega versión corregida de Plan de Manejo al CS
- 17 setiembre: Taller de presentación del Plan de Manejo en Acosta y Aserrí (9AM Aserrí, 2PM Acosta)
- 18 setiembre: Taller de presentación del Plan de Manejo en Santa Ana, ese día se entrega impreso y en digital.
- 25 de setiembre: tiempo límite para que los actores envíen comentarios sobre el PM a la FN.
- 30 setiembre: FN entrega versión final de PM a CS con incorporaciones totales

3. Se utilizará la cobertura FONAFIFO 2005 para la zonificación, por ser la oficial, siguiendo la recomendación de ACOPAC.

Actividad:	**Reunión de Comité de Seguimiento**
Proyecto:	**Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú**
Lugar:	ACOPAC/ Puriscal
Fecha:	17/08/2015
Objetivo	Zonificación y detalles finales del diagnóstico

Nombre	Institución	Contacto	Firma
Helmut Johnson M.	Muni. Santa Ana	hjohnson@scostarica.go.cr	
Gerardo Umaña	ACOPAC		
Alex Ivan Sáenz	ACOPAC		
Alfonso Duarte Morén	SINAC-ACOPAC	alfonso.duarte@sinac.go.cr	
Francisco Jiménez Quirós	ACOPAC-UT-PNE	francisco.jimenez@SINAC.go.cr	
Gretel Aguirre Alfaro	Muni Mora	gestionambiental@mora.go.cr	
Andrea Montero Cordero	Asociación CRxS	amontero@costaricaporsiempre.org	
Sergio Vargas Gómez	(ACOPAC OSRP.)	Sergio.Vargas@sinac.go.cr	
Adriana Fernández	Fundación Neotropica	afernandez@neotropica.org	

Minuta 10

Reunión Comité de Seguimiento
Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
26 de agosto, 2015

7. **Participantes:** Alfonso Duarte (ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), Francisco Jiménez (ACOPAC), Marcia Carranza (Fundación Neotrópica), Marco Hidalgo (Fundación Neotrópica) Grettel Agüero (Municipalidad de Mora) Helmut Johnson (Municipalidad de Santa Ana) Andrea Montero (Asociación Costa Rica por Siempre)

2. Lugar: Asociación Costa Rica por Siempre

3. Motivo de la reunión: Zonificación ZPCE

4. Duración de la reunión: 2 horas.

Acuerdos

1. Se aprueba la versión del Diagnóstico Final presentada por FN, con la salvedad que se le incorporen las correcciones indicadas por Andrea y Francisco, además se le deberá colocar sello de agua con las palabras "no oficializado".

2. Por decisión unánime se decide utilizar la capa de cobertura forestal de FONAFIFO 2005. Se accede a firmar por parte de todos los miembros del C. S. una carta con este acuerdo y la explicación técnica/legal que lo sustenta, para presentar al Ministro del Ambiente en caso de ser solicitada.

3. Neotrópica enviará la presentación a utilizar en el taller al C. S. a más tardar el jueves 27 de agosto a la 1:00 pm.

4. Se acuerda que las consultas durante el taller serán atendidas de la siguiente manera:

- Legislación, permisos y justificación técnica: ACOPAC Gerardo asignará a alguien que conteste.
- Trámites administrativos para permisos y demás: Grettel y Helmut
- Proceso de construcción de mapas e insumos utilizados: F. N. y CDG

5. El taller en T. I. Quitirrisí deberá realizarse entre el 10 - 12 de setiembre o antes de esta fecha.

6. Próxima reunión del C. S. para justificación del COLAC y estructura participativa será el 21 de setiembre 1:30 pm en ACRxS.

Actividad:	**Reunión de Comité de Seguimiento**
Proyecto:	**Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú**
Lugar:	Asociación Costa Rica por Siempre
Fecha:	26/08/2015
Objetivo	Zonificación ZPCE

Nombre	Institución	Contacto	Firma
Marcio Carranza V	F. N.	mcarranza@neotropica.org	
Francisco Jiménez Q	ACOPAC	francisco.jimenez@sinac.go.cr	
Gerardo Chaverri	Acopac	gerardo.chaverri	
Alfonso Durante Morín	SINAC-ACOPAC	alfonso.durante@sinac.go.cr	
Gabriel Bogarín Alfaro	MUNI MORA	gestionambiental@mora.go.cr	
Helmut Johnson M.	Muni. Santa Ana	hjohnson@santaana.go.cr	
Marco Hidalgo Chaverri	Fundación Neotropica.	mhidalgo@neotropica.org	
Andrea Montero C.	Asociación CR×S	amontero@costaricaporsiempre.org	

Minuta 11

Minuta de Actividad
Reunión de Coordinación con el Comité de Seguimiento Plan General de Manejo
Zona Protectora Cerros de Escazú

Fecha: 5 octubre de 2015
Lugar: Sede central Fundación Neotrópica
Objetivo: planificación del taller final de presentación del PGM
Participantes: Gerardo Chavarría (ACOPAC) Francisco Jiménez (ACOPAC) Marco Hidalgo (Fundación Neotrópica) Adriana Fernández (Fundación Neotropica) Marcia Carranza (Fundación Neotropica)

Agenda:

1. Estatus solicitud de ampliación de plazo ante Sala
2. Presentación (resumen) del Plan de Manejo corregido por parte de Neotrópica
3. Planificación de talleres de presentación del PGM
4. Actualización consulta Quitirrisí
5. Repaso de próximas fechas

Acuerdos

- Si al viernes 09 de octubre, la Sala no ha enviado respuesta a la solicitud de ampliación plazo para la publicación del Plan de Manejo; Gerardo (ACOPAC) irá a las oficinas de la Sala.
- Marcia enviará a los actores la "solicitud de ampliación de plazo" enviada a la Sala con sello de recibido y el machote de carta que solicitaron.
- Se aprueba la metodología propuesta para el Taller de presentación del PGM
- ACOPAC enviará la carta de invitación a los próximos talleres en el TI Quitirrisí, a Jorge Cole el martes 06 de octubre.

Actividad:	**Reunión de Comité de Seguimiento**
Proyecto:	**Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú**
Lugar:	Fundación Neotrópica
Fecha:	05/10/2015
Objetivo	Revisión del plan de manejo y planificación de talleres finales, y otros asuntos

Nombre	Institución	Contacto	Firma
Francisco Jiménez Quirós	ACOPAC	24167068 ext 125	
Gerardo Chaverri F.	ACOPAC.	8309-3432	
Marcia Carranza V.	F.N.	2289-4079/ 8349-5168	
Marco Hidalgo Chaverri	F.N.	2253-2130	
Adriana Fernández	FN	8544-72-22	

Minuta 12

Reunión del Comité de Seguimiento
Proyecto: Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Martes 13 octubre, 2015

1. Participantes: Helmut Johnson (Municipalidad Santa Ana), Andrea Montero (Costa Rica por Siempre), Pamela Castillo (Costa Rica por Siempre), Marco Hidalgo (Fundación Neotropica), Marcia Carranza (Fundación Neotropica)

2. Lugar: Oficinas Asociación Costa Rica por Siempre

3. Motivo de la reunión: conformación del Consejo Local de la Zona Protectora Cerros de Escazú y seguimiento acuerdos de la reunión del lunes 5 de octubre

4. Hora de la reunión: 9:00 a.m. – 12:00 m.d.

5. Agenda:

1. Solicitud del Plazo a Sala Constitucional por parte de ACOPAC
2. Impresiones del taller de presentación Santa Ana (Presentación Plan Manejo)
3. Consulta al territorio Indígena Quitirrisí
4. Fechas de cronograma
5. Constitución del Consejo Local

Acuerdos

1. Solicitar a Gerardo Chavarria de ACOPAC el estado de la respuesta de la Sala Constitucional, la cual debió tener respuesta formal el viernes 9 de octubre.

2. Las personas que asistieron a los talleres del 6 y 8 de octubre tiene hasta el jueves 15 de octubre para enviar comentarios u observaciones a la FN

3. Se mantiene el Taller de Presentación e Información en el Territorio Indígena Quitirrisí, para el sábado 17 de octubre del 2015.

4. Se mantiene el Cronograma de fechas programado para este proceso

5. Fundación Neotrópica enviará a Pamela el viernes 16 de octubre un correo borrador de consulta legal sobre la participación de la ADI de Quitirrisí como actor independiente o como un actor incorporado en la agenda local (ADI´s en general)

6. Fundación Neotrópica elaborará propuesta con el Procedimiento para la conformación del Consejo Local y un borrador de Decreto donde se definen las funciones de dicho Consejo Local. Fundación Neotrópica estará enviando dichos documentos con el Comité el lunes 19 de octubre.

7. Fundación Neotrópica preparara un borrador de “nota de cortesía” informando a actores dándole seguimiento a los acuerdos tomados en el proceso participativo del Plan de Manejo, la cual debe firmar ACOPAC.

8. ACOPAC deberá solicitar una sesión extraordinaria del Consejo Regional a inicios de noviembre para tratar el punto único de Plan de Manejo Cerros de Escazú y justificación para solicitar conformación del Consejo Local.

Lista de Asistencia

Reunión de Coordinación Comité de Seguimiento
Objetivo: Acuerdos tomados en reunión del 5 de octubre, Conformación del Consejo Local
Fecha: Martes 13 de octubre de 2015
Hora de inicio: 9:45am
Hora de cierre: 12:00pm
Lugar: Asociación Costa Rica por Siempre

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Pamela Castillo	ACRXS	22041730	pcastillo@costaricaporsiempre.org
Andrea Montero	ACRXS	2204-7350	amontero@costaricaporsiempre.org
Marco A. Hidalgo Ch.	Fundación Neotrópica.	2253-2130	mhidalgo@neotropica.org.
Marcia Carranza V	" "	" "	mcarranza@neotropica.org

Minuta 13

Reunión del Comité de Seguimiento
Proyecto: Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Martes 27 de octubre, 2015

8. **Participantes:** Alfonso Duarte (ACOPAC), Andrea Montero (Asociación Costa Rica por Siempre), Adriana Fernández (Fundación Neotrópica), Marco Hidalgo (Fundación Neotrópica), Marco Vinicio Araya (SINAC), Francisco Jiménez (ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC)

2. Lugar: Asociación Costa Rica por Siempre

3. Motivo de la reunión: Reunión Comité de Seguimiento

4. Duración de la reunión: 2 horas.

Puntos en discusión

1. Comentarios sobre zonificación por parte del departamento legal de ACOPAC
2. Situación consulta indígena Quitirrisí
3. Propuesta de declaración del Concejo Local
4. Revisión de productos pendientes entregados: Correcciones del PGM
5. Definición de las 6 figuras del PGM a imprimir (Anexo D producto 13)

Acuerdos

1. ACOPAC enviará a Fundación Neotropica los comentarios realizados al PGM por parte del Comité técnico, esto el jueves 29 de octubre.
2. Andrea, enviará los insumos de Jorge Cole sobre el estudio en TI Quitirrisí antes del viernes 30 de octubre, para que puedan ser incorporados al PGM. Una vez finalizado el estudio este se incluirá como un anexo al documento de diagnóstico.
3. Neotrópica incorporará a la declaración del Concejo Local enviada, un texto que explique la justificación de creación del COLAC ZPCE.
4. ACOPAC enviará a Neotrópica, antes del viernes 30 de octubre, las 6 figuras del PGM seleccionadas para imprimir.

Lista de Asistencia a actividad

Fecha: 27 octubre 2015
Hora de inicio: 11:30 am
Objetivo: Reunión de Comité de Seguimiento PGM – ZPCE

Temas de agenda:

1. Comentarios sobre zonificación por parte del departamento legal de ACOPAC
2. Situación de "consulta indígena" TI-Quitirrisi
3. Propuesta de Declaración del Consejo Local
4. Revisión de productos pendientes entregados: Correcciones PGM
5. Definición de las seis figuras del PGM a imprimir (Anexo D producto 13)

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Mario Vargas	SINAC - PCRS	88098671	mario.vargas@sinac.go.cr
Adriana Fernández Sandoval	Fundación Neotropica	8544-72-22	afernandez@neotropica.org
Jasmine Jiménez Quirós	SINAC - ACOPAC	24167068 ext 125	jasmine.jimenez@sinac.go.cr
Andrea Montero C.	Asociación CRxS	2204-7351	amontero@costaricaforsiempre.org
Gerardo Chavarría	ACOPAC	83093432	gerardo.chavarria@sinac.go.cr
Marco Hidalgo Ch.	Fundación Neotrópica	2253-2150	mhidalgo@neotropica.org
Alfonso Duarte M.	SINAC-ACOPAC	87091085	alfonso.duarte@sinac.go.cr

4.2 Sesiones especiales con ACOPAC

Minuta 1 - ACOPAC

Reunión con ACOPAC
Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
02 de junio, 2015

9. **Participantes:** Alfonso Duarte (ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), Francisco Jiménez (ACOPAC), Efraín Monge (ACOPAC) Adriana Fernández (Fundación Neotrópica), Marcia Carranza (Fundación Neotrópica), Marco Hidalgo (Fundación Neotrópica)
2. Lugar: Oficinas ACOPAC Puriscal
3. Motivo de la reunión: Analizar detalles de la zonificación
4. Duración de la reunión: 2 horas.
Acuerdos - Se realizará una sesión especial con Carlo Magno (INTA) el 09 de junio, con el fin de ver el estado actual del "Estudio de Suelos de la ZPCE" y acordar la fecha de finalización de este estudio, ya que es un insumo fundamental para la zonificación. A esta reunión asistirá Fundación Neotrópica y Alfonso de ACOPAC.

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
AREA DE CONSERVACION PACIFICO CENTRAL
DEPARTAMENTO AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

Actividad: Reunión Miembros Fundacion Neotropica Seguimiento Plan de Manejo Zona Protectora Cerrros de Escazu

Fecha: 02 / 06 / 2015

Nombre Completo	Dependencia	Firma	Correo
Marcia Carranza Vargas	Fundación Neotropica		mcarranza@neotropica.org
Adriana Fernandez Sáenz	Fundación Neotropica		afernandez@neotropica
Francisco Jimenez Chaverri	UT-ACOPAC		francisco.jimenez@SINAC.go
Marco Hidalgo Chaverri	Fundación Neotropica.		mhidalgo@neotropica.org
Eliecer Mora Hernández	OSRP		elmora.mora@yahoo.es
Alonso Duarte Mora	SINAC-ACOPAC		alonso.duarte@sinac.go.cr
Gerardo Chaverri Arguedas	DAFP-Acopac		gerardo.chaverria@sinac.go

Hora inicio: _____. Hora Cierre: _____.

Minuta 2 -ACOPAC

Reunión con ACOPAC
Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Lunes 09 de noviembre, 2015

10. **Participantes:** Alfonso Duarte (ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), Francisco Jiménez (ACOPAC), Andrea Montero (Asociación Costa Rica por Siempre), Adriana Fernández (Fundación Neotrópica), Marcia Carranza (Fundación Neotrópica), Carolina Muñoz (ACOPAC)
2. Lugar: Oficinas ACOPAC Puriscal
3. Motivo de la reunión: Revisión final del PGM de la ZPCE
4. Duración de la reunión: 2 horas.
Agenda **1.** Puntos generales **2.** Revisión de observaciones del Comité Técnico de ACOPAC al PGM **3.** Situación del proceso de información al TI Quitirrisí
Acuerdos 1. Fundación Neotrópica incluirá en el documento de sistematización el resumen ejecutivo del PM. 2. Neotrópica debe entregar de forma impresa el resumen ejecutivo del PM como un documento por aparte (incluir equipo técnico a cargo del proceso y su profesión) y la zonificación. Esto para ser agregado al expediente en físico del PM en ACOPAC. 3. El 16 de noviembre Neotrópica enviará al Comité de Seguimiento la propuesta de presentación del PM al CONAC. 4. El 23 de noviembre se hará la presentación formal del PM de la ZPCE al CONAC 5. Carolina enviará por correo el criterio legal referente al TI Quitirrisí para ser incorporado al PM. 6. Neotrópica enviará el martes 10 de noviembre el SHP del translape del TI Quitirrisí y el SHP de la zonificación a Minor de ACOPAC, para que proceda a calcular los porcentajes que corresponde a cada zona de intervención en el TI.

Actividad:	**Reunión de Comité de Seguimiento**
Proyecto:	**Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú**
Lugar:	ACOPAC-Puriscal
Fecha:	09/11/2015
Objetivo	Revisión final del PGM de la ZPCE

Nombre	Institución	Contacto	Firma
Marcia Carranza V	Fundación Neotrópica	mcarranza@neotropica.org	
Carolina Muñoz Solís	ACOPAC-SINAC	carolina.munoz@sinac	
Alfonso Duarte M.	SINAC-ACOPAC	alfonso.duarte@sinac.go.cr	
Mario Hidalgo Chaverri	Fundación Neotrópica	mhidalgo@neotropica.org	
Francisco Jiménez Quirós	ACOPAC	francisco.jimenez@sinac.go.cr	
Gerardo Chaverri Polini	ACOPAC	gerardo.chaverri@sinac.go.cr	
Adriana Fernández S.	Fundación Neotrópica	afernandez@neotropica.org	
Andrea Montero Cordero	Asociación CRES	amontero@costaricaporsiempre.org	

4.3 Sesiones especiales con Jorge Cole (Actuar)- Proceso de información Territorio indígena Quitirrisi (TIQ)

Minuta 1 -TIQ

Reunión Consulta social Reserva Indígena Quitirrisí
PGM Cerros de Escazú
Miércoles 02 de setiembre, 2015

11. **Participantes:** Francisco Jiménez, Minor Hidalgo, Efraín Monge, Liliana Rubí (ACOPAC), Andrea Montero, Pamela Castillo (Asociación Costa Rica por Siempre), Marcia Carranza (Fundación Neotrópica), Grettel Agüero (Municipalidad Mora) y Jorge Cole (ACTUAR)
2. Lugar: Oficinas Asociación Costa Rica por Siempre
3. Motivo de la reunión: Analizar la situación actual y pasos a seguir para la consulta con actores de la Reserva Indígena Quitrrisí
4. Inicio y duración de la reunión: 2:00 PM, 1,5 Horas
Pasos a seguir • Pamela consulta acerca de especificidades para el facilitador de estos talleres. Jorge se muestra interesado y menciona que, como ACTUAR, trabajan actualmente con grupos en la zona como CODESE y *Nacientes Palmichal* • Jorge recomienda diseñar un taller un sábado de 9am a 3 pm, todo el día. Sería conveniente hacerlo por separado (según los dos grupos mencionados por Grettel) **Acuerdos** 1. Se solicitará a CGR un aplazo de 2 meses y no de 1 mes; considerando que este proceso tomará 1 mes 2. Jorge Cole ofrece su apoyo como asesor técnico dentro del proceso del PGM Cerros de Escazú a través de: • Mapeo de actores previo al taller: entrevistas a DINADECO, CONAI, Mesa indígena, Consejo de Ancianos, etc. • Facilitación de los talleres de "pre-consulta" 3. **7 setiembre:** Jorge Cole le estará enviando a la ACRXS, su propuesta técnica metodológica tomando en cuenta estos 2 productos principales. Los costos asociados a la realización de estos talleres (logística, comida, materiales) están ya contemplados en el contrato actual con Neotrópica, por lo que ya están cubiertos. 4. **3 setiembre:** Francisco Jiménez de ACOPAC le enviará a Jorge Cole imágenes aéreas con información de tenencia de tierra en la Reserva Indígena. 5. **3 setiembre:** Marcia Carranza de Neotrópica le enviará a Jorge Cole y Minor Hidalgo mapas de zonificación y tenencia de tierras y Diagnóstico no oficializado. 6. **4 setiembre:** Marcia Carranza asistirá con Minor Hidalgo al Registro Inmobiliario Nacional para obtener la información anteriormente solicitada del detalle sobre ZP Cerros de Escazú.

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
ÁREA DE CONSERVACIÓN PACIFICO CENTRAL
Dirección Regional

MINAET
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones

LISTA DE ASIST

Reunion: PM-ZPCE Reserva indigena Tayurisi

Fecha: 02-09-2015

Nombre Completo	Dependencia	Firma	Hora Entrada	Hora de Salida	Correo Electrónico
Lilliana Rubi	ACOPAC DASP		1:45 pm		
Erwin Monge Vela	OSRP		1:45 p.m.		erwin.monge@sinac.go.cr
Minor Hidalgo	ACOPAC		1:40 p.m.		minor.h.dalgo@sinac.go.cr
Francisco Jiménez	ACOPAC-UT		1:40 P.M.		francisco.jimenez@SINAC.go.cr
Pamela Castillo	ACRN		1:40 pm		pcastillo@costaricaporsiempre.org
Andrea Montero C	ACRS		1:40 pm		amontero@costaricaporsiempre.org
Marco Cerdas	Fundación Neotrop		2:10 Pm		marcocerdas@neotropico
JORGE COLE	ACTUAR	VIA LLAMADA			jorgecolee actuarcostarica.com
GRETTEL AGUERO	MUNICIPALIDAD MORA	VIA LLAMADA			gestionambiental@mora.go.cr

LISTA DE ASISTENCIA

Misión Institucional: El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de Costa Rica gestiona, integralmente, la conservación y manejo sostenible de la vida silvestre, los recursos forestales, las áreas silvestres protegidas, cuencas hidrográficas y sistemas hídricos; en conjunto con actores de la sociedad para el bienestar de las actuales y futuras generaciones.
T: Central (506)2416-70-68 /F: (506)2416-5017 San José, Costa Rica /Web: www.sinac.go.cr

Gobierno de Costa Rica
CONSTRUIMOS UN PAIS SEGURO

Minuta 2-TIQ

Minuta de Actividad
Reunión entre ACTUAR y Fundación Neotropica
Plan General de Manejo Zona Protectora Cerros de Escazú

Fecha: viernes 02 Octubre de 2015
Lugar: Sede Central Fundación Neotrópica, San Pedro
Objetivo: planificación de talleres en el territorio Indígena Quitirrisí
Participantes: Jorge Cole y Marco Hidalgo

Agenda:

- Coordinar asuntos relevantes a la convocatoria y ejecución de los talleres para el proceso de información al territorio indígena

Acuerdos

1. La carta de Invitación de ACOPAC a la ADI tiene que estar entregada a más tardar el martes 6 de octubre
2. Los Talleres del proceso de consulta están definidos para los sábado 10 y 17 de Octubre.
3. Para los Talleres se necesita la presencia de un funcionario con conocimiento del proceso de plan de manejo y pueda abarcar las consultas de los participantes.
4. ACTUAR enviara al comité de seguimiento la Estructura Final de los talleres del 10 y 17 y el Plan de Trabajo del proceso
5. Para las entrevistas con el MAG y Municipalidad de Mora, ACTUAR necesita la presencia de Fundación Neotropica. Fechas tentativas miércoles 7 o viernes 9 Octubre.

Actividad:	**Reunión con ACTUAR**
Proyecto:	**Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú**
Lugar:	Fundación Neotrópica
Fecha:	02/10/2015
Objetivo	Planificar los talleres del territorio indígena Quitirrisí

Nombre	Institución	Contacto	Firma
Jorge M. Colev	Actuar	8335-33-22	
Mario Hidalgo Chaverri	Fundación Neotropica	2253-8130	

5. Registro de los talleres con actores

Taller 1. Presentación inicial del Proyecto de Elaboración del Plan General de Manejo para la Zona Protectora Cerros de Escazú

Santa Ana

27-02-2015

Actividad: Taller (3 horas de duración).
Elaboración e Implementación del Taller: Fundación Neotrópica y Comité de Seguimiento.
Facilitadores: Bernardo Aguilar González y Lorena Erbure de Fundación Neotrópica, Marco Vinicio Araya (SINAC) y Alfonso Duarte (ACOPAC).
Lugar: Gimnasio de la Municipalidad de Santa Ana.
Día y Hora: viernes 27 de febrero de 2015 de 9:00am a 12pm.

Objetivo del Taller:

Dar a conocerla la ruta del proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a los actores locales, instituciones, organizaciones, etc., así como informar sobre los espacios existentes para participar activamente en este proceso, los pasos a seguir y la manera de trabajar.

Registro fotográfico

Lista de asistencia

Lista de Asistencia

Taller de Presentación del Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Objetivo: Facilitar un proceso participativo con el fin de explicar la ruta de proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a actores locales, instituciones, organizaciones, etc.

Fecha: Viernes 27 de febrero, 2015.

Hora de Inicio: 9:00 am

Hora de Cierre: 12 md.

Lugar: Gimnasio Municipal de Santa Ana

	Nombre	Institución/Organización	Teléfono	Correo Electrónico
	Olga Castro B.	Asada de Corralar	2418-81-61	olgacastrocascante e hotmail. com
	Olga Marín B	Asada de Corralar	2418 84 27	
	JULIUS LAWDELL-MILLS	HACIENDA MONTE GRECO	8885 6090	julius1m@gmail.com
	Hugo Arroyo	MORA	88538789	
	Rigoberto Lopez G	Mora.	83930814	rigoguillies 2011@Hotmail com
	Marco Ant Alvarado A	Productores de Cafe San Rafael.	87212898	marcoantonioalvarado@gmail.com
	WILBUR ARCE M.	MUNI MORA	8344-5951	arcewill@gmail.com
	Erika Angulo Campos	Municipalidad de Mora	22490500 ext 108	controlconstructivo@mora.go.cr
	Gritted Rojas Alfaro	Munic de Mora	87026534	gestionambiental@mora.go.cr

Lista de Asistencia

Taller de Presentación del Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Objetivo: Facilitar un proceso participativo con el fin de explicar la ruta de proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a actores locales, instituciones, organizaciones, etc.

Fecha: Viernes 27 de febrero, 2015.

Hora de Inicio: 9:00 am

Hora de Cierre: 12 md.

Lugar: Gimnasio Municipal de Santa Ana

	Nombre	Institución/Organización	Teléfono	Correo Electrónico
	Digna Yi Guzmán Madrigal	Monic. Poasocal	8895591-01	lguzmanm84@hotmail.com.
	Isabel Madriga TA	A y A Puriscal	88237844	imadrigal@aya.go.cr
	Pablo Fernández Brenes	AyA. Puriscal	8896-13-99	pfernandez@aya.go.cr
	GIOVANNI FONSECA	VECINO CANTÓN DE MORA	7075-7780	gfonsecayco@hotmail.com.
	Karla Barrantes Chaves	ProDUS—UCR Plan Regulador	2511-2784	karla.barrantes@ucr.ac.cr
	JORGE ROSS ARAYA	PROPIETARIOS MIRAZ	8817-4400	JROSS@GJEABOGADOS.com
	Yolima Ramirez Echavarría	vecina de Piedades calle los Mena	8930 45-30	yoli2002000@Hotmail.com
	Rigoberto Gandi Gandi	CODECE	89827038	rigogandi0860@hotmail.es
	Maylin Chamorro Obregón	Asoc. CODECE.	22280183	codececr@gmail.com.

Lista de Asistencia

Taller de Presentación del Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Objetivo: Facilitar un proceso participativo con el fin de explicar la ruta de proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a actores locales, instituciones, organizaciones, etc.

Fecha: Viernes 27 de febrero, 2015.

Hora de Inicio: 9:00 am

Hora de Cierre: 12 md.

Lugar: Gimnasio Municipal de Santa Ana

	Nombre	Institución/Organización	Teléfono	Correo Electrónico
	Miguel Gonzalez G	MINAE OSRP	2416-78-78	miguelconeja@gmail.com
	Efraín Monge Hernández	ACOPAC-OSRP	2416-7878	efrain.monge@sinac.go.cr
	Fulvia Wohl Jiménez	ACOPAC - SINAC	2416-7068	fulvia.wohl@sinac.go.cr
	Gerardo Chavarría Anadrior	ACOPAC - SINAC	2416-7068	gerardo.chavarria@sinac.go.cr
	Alex Brenes Soto	ACOPAC-SINAC	2416 7878	alex.brenes@sinac.go.CR

Lista de Asistencia

Taller de Presentación del Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Objetivo: Facilitar un proceso participativo con el fin de explicar la ruta de proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a actores locales, instituciones, organizaciones, etc.

Fecha: Viernes 27 de febrero, 2015.

Hora de Inicio: 9:00 am

Hora de Cierre: 12 md.

Lugar: Gimnasio Municipal de Santa Ana

	Nombre	Institución/Organización	Teléfono	Correo Electrónico
	Priscilla Venegas Carvajal	Municipalidad de Mora	2249-10-50 Ext: 150	informacionegeografica@mora.go.cr
	Jose Rojas Cordoba	Asociacion Desarrollo SANTA ANA	84701702	Jose.rojas@ymail.com
	Helmut Johnson M.	Muni. Santa Ana	2582-7412	hjohnson@santaana.go.cr
	Marco V. Mavoja D	SINAC-SE	25726500	marco.vinaya@sinac.cr
	Andrea Montero	ACKxS	2204-7350	amantenpastancofriemfe.org
	Manuel Alvarado F	municipalidad ANA	22281541	ivanmiralca@gmail.com.
	Jody Winer / Mark Shaw	—	2203-2375	jodymark2004@yahoo.com
	Gilbert Charpentier.	MAG	83665224	jgilbertcharpentier.@hotmail.c
	Jose Fco Jimenez A.	MAG	24170509	Francisco.jimenez.mag@gmail.com

Lista de Asistencia

Taller de Presentación del Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Objetivo: Facilitar un proceso participativo con el fin de explicar la ruta de proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a actores locales, instituciones, organizaciones, etc.

Fecha: Viernes 27 de febrero, 2015.

Hora de Inicio: 9:00 am

Hora de Cierre: 12 md.

Lugar: Gimnasio Municipal de Santa Ana

	Nombre	Institución/Organización	Teléfono	Correo Electrónico
	Jorge L. Luna Luna	ADI Tabarcia Luna	85-78-26-02	
	Paulina Morales Alpízar	Centro Ag. Cantonal de Santa Ana (Cacsa)	87506869	Cacsa@ice.co.cr
	Juan A Mesén Rodriguez	Centro agrícola cantonal de Santa Ana	57-11-70-12	
	ana marizo mena morales	ti ti / o personal	84 33 20 17	
	Fernando Lee Mora A.	Personal	88115166	ferlee24@gmail.com
	Ana Patricia Arias	arquitecta / personal	8873-7874	anapatriciaarias@gmail.com
	Ana del Carmen Gutiérrez M	Propietaria, Escazú	5100 67 80	anadelcarmengutierrez@gmail.com
	Ricardo Guillén Montero	MAG	88601680	rguillenm@costarricense.cr
	Orlando Cubillo Jiménez	MAG / Dirección Regional	2416 51-57	ocubillo@mag.go.cr.

Lista de Asistencia

Taller de Presentación del Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Objetivo: Facilitar un proceso participativo con el fin de explicar la ruta de proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a actores locales, instituciones, organizaciones, etc.

Fecha: Viernes 27 de febrero, 2015.

Hora de Inicio: 9:00 am

Hora de Cierre: 12 md.

Lugar: Gimnasio Municipal de Santa Ana

	Nombre	Institución/Organización	Teléfono	Correo Electrónico
	José Martí Jiménez	MAG - AGTSA	27822116	josemartij@hotmail.com
	Miguel Hussmann Quirós	Asociación Tropicalerías Cerros Escazú	88690351	WhatsApp.
	Augusto Fernández Zeledón	Vecino Pabellón	86291717	AgPabellón@Hotmail.com
	Marbelle Arias Fernández	Munic. Escazú	22875.59	jcontraloriaambiental@municescazu.go.cr
	AKirya González Jiménez	Global Outsourcing	60520208	akiryag@gmail.com CR
	Ernesto Jiménez Sotomayor	Global Outsourcing	8845 2627	jimenezsotomayor@gmail.com
	Daniel Naylor Thiele	Vicepresidente concejo municipal Escazú	88266858	escazunews@yahoo.com
	Lilliana Alvarez Anchía	UNGASU	8356-74-20	lillyalvarez@gmail.com
	Alfonso Duarte Marín	SINAC-ACOPAC	87091085	alfonso.duarte@sinac.go.cr

Lista de Asistencia

Taller de Presentación del Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Objetivo: Facilitar un proceso participativo con el fin de explicar la ruta de proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a actores locales, instituciones, organizaciones, etc.

Fecha: Viernes 27 de febrero, 2015.

Hora de Inicio: 9:00 am

Hora de Cierre: 12 md.

Lugar: Gimnasio Municipal de Santa Ana

	Nombre	Institución/Organización	Teléfono	Correo Electrónico
	María J. Pacheco	Asoc. vecinos Pabellón	83918552	mariaLourdes.pacheco@gmail.com
	Ana Rosa Viveña Solís	Asoc. Vecinos Pabellón	87239840	Taller.nazareno16@gmail.com
	Rafael Angulo Jiménez	Asoc. Vecinos del Pabellón	22-82-5155	—
	Manuel Ant Arley	Aura del Sol	8389-74217	xyzarley@gmail.com
	Patricia Segovia Pinto	vecina pabellón	83111808	pspatricia370@gmail.com
	Jose Castro Solís	CDG	2288700	josecastro@cdg-ca.com
	Michael Gucovsky	CDG	11	11
	Camilo Mena M.		89757699	—
	Gustavo A Sauma Fernández	Monte Bellavista	22030404	gsauma@saumaabogados.com

Lista de Asistencia

Taller de Presentación del Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Objetivo: Facilitar un proceso participativo con el fin de explicar la ruta de proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a actores locales, instituciones, organizaciones, etc.

Fecha: Viernes 27 de febrero, 2015.

Hora de Inicio: 9:00 am

Hora de Cierre: 12 md.

Lugar: Gimnasio Municipal de Santa Ana

	Nombre	Institución/Organización	Teléfono	Correo Electrónico
	Mariano Lobo Cabezas	Muni Sta Ana	87067594	relamaria@hotmail.com

Taller 1: Taller de Presentación del Proyecto de Elaboración del Plan General de Manejo para la Zona Protectora Cerros de Escazú

06-03-2015

ACOSTA

Actividad: Taller (3 horas de duración).
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento.
Facilitadores: Marco Hidalgo Chaverri, Alexander González y Adriana Fernández de Fundación Neotrópica, Marco Vinicio Araya (SINAC) y Francisco Jiménez (ACOPAC).
Lugar: Municipalidad de San Ignacio de Acosta.
Día y Hora: viernes 6 de marzo de 2015 de 10am a 1pm.

Objetivo del Taller: Dar a conocerla la ruta del proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a los actores locales, instituciones, organizaciones, etc., así como informar sobre los espacios existentes para participar activamente en este proceso, los pasos a seguir y la manera de trabajar

Registro fotográfico

Lista de asistencia

Lista de Asistencia

Taller de Presentación del Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Objetivo: Facilitar un proceso participativo con el fin de explicar la ruta del proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a actores locales, instituciones, organizaciones, etc.
Fecha: Viernes 6 de marzo de 2015
Hora de inicio: 10:00am
Hora de cierre: 1pm
Lugar: Municipalidad de San Ignacio de Acosta

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Felipe Murrom M	MUNIC ACOSTA	24100186	gestionambientalacosta@gmail.com
Efraín Mongalo	ACOPAC-OSRP	2416-7878	efrain.mongy@sinac.go.cr
Miguel Gonzalez	ACOPAC-OSRP	2416-78-78	miguel.conejc@gmail.com
Abel Acosta	INFORest	22320888	Rafaelacost@infonet.co.cr
Edna Arias Fallas	Grupo Giras	2410-0029	grupogiras@gmail.com.
Cindy Blamonte Muñoz	INA	83659939	cblamontemunoz@ina.ac.cr
Wilbert Camacho Espinoza	Regente Forestal	83208095.	wilcae3@yahoo.com.
Roxana Agüero	Asada y ADI Palmichal	87479137	roxazouse@gmail.com

Lista de Asistencia

Taller de Presentación del Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Objetivo: Facilitar un proceso participativo con el fin de explicar la ruta del proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a actores locales, instituciones, organizaciones, etc.

Fecha: Viernes 6 de marzo de 2015

Hora de inicio: 10:00am

Hora de cierre: 1pm

Lugar: Municipalidad de San Ignacio de Acosta

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Alex Mendy Soto	ACOPAC-SINAC	24100979	alex.mendy@sinac.go.cr
Paulina Calderón Meseén	FUNDECOA /UCR	83512034	pcmesen@gmail.com
Enrique Vargas Ramírez	Inder	25421653	enriquez@inder.go.cr
Priscila C.V	BAE Palmichal	24189101	priscilacvcante@gmail.com
Roberto Ramírez	ADESSARL	24184360	hermn@recambiosp.hotmail.com
Edgar Vindas Monge	ASADA San Luis Acosta	2410-15-20	edgarvindas.monge@yahoo.es
Antonio María Barboza	FUNDECOA	83438453	ajmbeto@hotmail.com
Tobías Monge Azofeifa	Municipalidad	88664236	timonge19@gmail.com
Roxana Azofeifa Meza	ASADA y ADI Palmichal	87479137	roxazare@gmail.com

Lista de Asistencia

Taller de Presentación del Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Objetivo: Facilitar un proceso participativo con el fin de explicar la ruta del proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a actores locales, instituciones, organizaciones, etc.

Fecha: Viernes 6 de marzo de 2015

Hora de inicio: 10:00am

Hora de cierre: 1pm

Lugar: Municipalidad de San Ignacio de Acosta

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Francisco Jiménez O	ACOPAC	2146 7068 ext 125	francisco.jimenez@sinac.go.cr
Lilliana Rubi Jiménez	ACOPAC-SINAC	2416-70-68 ext 115	lilliana.rubi@sinac.go.cr
Karla Arias Castro	UNED - Acosta Grupo Ecologico UNED-Acosta	85-88-61-55 / UNED 2410-34-4	Karza_05@Hotmail.com
Elvidio Barboza B	Asada de Chirraca	2410-21-00	
Daniel Figueroa Arm.	Ministerio de salud Acosta	2410-0192	figueroa.daniel88@gmail.com
Fernando Ruiz A	Finca Ganadera C.	22706951	
Olman Urena S.	Asoc. Des. San Pablo	8363-8728	olmanurena@hotmail.com
Marco V. Arroyo P	SINAC-CE.	25226500	marco.arroyo@sinac.go.cr

Lista de Asistencia

Taller de Presentación del Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Objetivo: Facilitar un proceso participativo con el fin de explicar la ruta del proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a actores locales, instituciones, organizaciones, etc.

Fecha: Viernes 6 de marzo de 2015

Hora de inicio: 10:00am

Hora de cierre: 1pm

Lugar: Municipalidad de San Ignacio de Acosta

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Adrián Fallas Corrales	UNED-Fundecoa	2544 05 16	cvickernat02@gmail.com
Karla Arias Castro	UNED-Acosta Grupo Ecologico UNED-Acosta	85-88-61-55 / UNED 2410-34-41	karza-05@Hotmail.com
Carlos Castro Solano	Lumual	83-17-98 60	cjalza@gmail.com
Christian Alvarez	Abogado - Lumual	89-12-78-99	cjalza@gmail.com
Josefa Morales	Ministerio de Salud	2410-01-42	Josmolla@ministeriodesalud.go.cr

Lista de Asistencia

Taller de Presentación del Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Objetivo: Facilitar un proceso participativo con el fin de explicar la ruta del proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a actores locales, instituciones, organizaciones, etc.

Fecha: Viernes 6 de marzo de 2015

Hora de inicio: 10:00am

Hora de cierre: 1pm

Lugar: Municipalidad de San Ignacio de Acosta

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Jayver Cordero Acosta	Finca Carragual	27758586	Carragual@Gmail.com
Honorio Campos B	Finca Carragual	24744103	Carragual@Gmail.com

Taller 1. Presentación del Proyecto de Elaboración del Plan General de Manejo para la Zona Protectora Cerros de Escazú

13- 03-2015

ASERRÍ

Actividad: Taller (3 horas de duración).
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento del proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú.
Facilitadores: Marco Hidalgo Chaverri, Bernardo Aguilar González y Adriana Fernández de Fundación Neotrópica, Marco Vinicio Araya (SINAC) y Gerardo Chavarría (ACOPAC).
Lugar: Municipalidad de Aserrí.
Día y Hora: viernes 13 de marzo de 2015 de 9am a 12pm.

Objetivo del Taller: Dar a conocerla la ruta del proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a los actores locales, instituciones, organizaciones, etc., así como informar sobre los espacios existentes para participar activamente en este proceso, los pasos a seguir y la manera de trabajar.

Registro fotográfico

Lista de asistencia

Lista de Asistencia

Taller de Presentación del Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Objetivo: Facilitar un proceso participativo con el fin de explicar la ruta del proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a actores locales, instituciones, organizaciones, etc.
Fecha: Viernes 13 de marzo de 2015
Hora de inicio: 9:00am - **Hora de cierre:** 12:00pm
Lugar: Municipalidad de Aserrí

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Raúl Fallas Corrales	A y A	89081422	rfallasc84@gmail.com.
Sergio Feoli Borochi	CNFL	80155010	sfeoli@cnfl.go.cr
Marvin Rodríguez	Muni Aserri	8367-3357	mrodriguez6@muni.aserri.go.cr
Rodolfo Murillo Fernández	Asada Bo Mercedes	25000222	asadabmercedes@gmail.com
Eladio Fernández Herrera	" "	" "	" " "
Francisco Hernández V.	Asadas Pass de Aserrí	22304514	asadapass@yahoo.es
Leticia Castro Moreno	Presidenta Municipal Aserrí	87255849	leticm16@gmail.com
Wilberth Jiménez Guzmán	Canton Mora/San Rafael	88666975	wjjimenez@racsa.co.cr.
Johanna Avila Vargas	Mun. Alajuelita	70167002	jchandreavila@gmail.com
Víctor J. Mora	vecino Alajuelita	22521257	

Lista de Asistencia

Taller de Presentación del Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Objetivo: Facilitar un proceso participativo con el fin de explicar la ruta del proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a actores locales, instituciones, organizaciones, etc.

Fecha: Viernes 13 de marzo de 2015

Hora de inicio: 9:00am - **Hora de cierre:** 12:00pm

Lugar: Municipalidad de Aserrí

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Vigny Alvarado C.	Asociación de Desarrollo	88293874	valvarado@gmail.com
Francis Monge C.	SAGA. S.A.	8389-48-45	
Jorge I. Guido G.	Saga. S.A.	8349-96-49	
Marco V. Arya.	SINAC-SE-PCRES	25226500	marco.arya@sinac.go.cr
Aurora Soto Rojas	M. A. G: Aserrí	84999198	aurorasoto27@hotmail.com
Geovanni Chibal	Vecino de la Zona	8840-4087	geovach21@gmail.com
Gerardo Chaverri	ACOPAC	83093432	gerardo.chaverri@sinac.go.cr
Ally Brenes Jara	ACOPAC	6040 2205	ally.brenes@sinac.go.cr
Sandra Prado R.	Municipalidad Aserrí.	2230. 30.78.	sprado@aserri.go.cr.
Gerardo Víquez Esquivel	Municipalidad Desamparados	22173575	gviquez@desamparados.go.cr

Lista de Asistencia

Taller de Presentación del Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Objetivo: Facilitar un proceso participativo con el fin de explicar la ruta del proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú a actores locales, instituciones, organizaciones, etc.

Fecha: Viernes 13 de marzo de 2015

Hora de inicio: 9:00am - **Hora de cierre:** 12:00pm

Lugar: Municipalidad de Aserrí

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Fernando Ruiz C.	Granadera Cargo	83836918	Meli_CRI@Hotmail.com
Daniel Brenes	Muni Aserrí	2223 0378	dbrenes@muni.aserri.go.cr
Priscila Jimenez Brado	Muni. Aserrí	2230-3098/88844733	pjimenez@aserri.go.cr

Taller 2. Validación del Diagnóstico socio ambiental y económico, Elementos Focales de Manejo y Mapeo de Actores

29-04-2015

ACOSTA

Actividad: Taller (6 horas de duración).
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento del Proyecto.
Facilitadores: Marcia Carranza Vargas, Marco Hidalgo Chaverri y Adriana Fernández.
Lugar: Municipalidad de San Ignacio de Acosta.
Día y Hora: miércoles 29 de abril de 2015 de 9am a 3pm.

Objetivo del Taller: Facilitar un proceso de participación local en el enriquecimiento de información y consolidación del documento Diagnóstico Socio ambiental y Económico de la Zona Protectora de los Cerros de Escazú (ZPCE) y los Elementos Focales de Manejo identificados para esta ASP.

Registro fotográfico



Lista de asistencia

Proyecto Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Lista de Asistencia

Taller de validación del diagnóstico socio ambiental y económico, elementos focales de manejo y mapeo de actores

Objetivo: Facilitar un proceso de participación local en el enriquecimiento de información y consolidación del documento Diagnóstico Socio ambiental y Económico de la Zona Protectora de los Cerros de Escazú y los Elementos Focales de Manejo identificados para esta ASP.

Fecha: Miércoles 29 de abril de 2015

Hora de inicio: 9am

Lugar: Municipalidad de San Ignacio de Acosta

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Aby Amaily Soy	SINAC-ACOPAC	2416-7882	aby.amaily@sinac.go.cr
Wilberth Camacho Espinoza	Municipalidad de Escazú	8320895	wilcae3@yahoo.com
Vigny Alvarado Castillo	ADEMCA	8829-3874	valvarad@gmail.com
Lilliana Rubí Jiménez	ACOPAC-SINAC	246-70-68 ext 115	lilliana.rubi@sinac.go.cr
Francisco Jiménez	ACOPAC-SINAC	2416 7068 ext 125	francisco.jimenez@sinac.go.cr
Edith B Tye	Independiente	84039210	
Marco Hidalgo Chaverri	Fundación Neotrópica	2253-2130	mhidalgo@neotropica.org
Marcia Carranza V.	Fundación Neotrópica	2253-2130	mcarranza@neotropica.org
Carole Braun	Fundación Neotrópica	2253-2130	cbrun@neotropica.org
Adriana Fernández	Fundación Neotrópica	8544-7222	afernandez@neotropica.org

Proyecto Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Lista de Asistencia

Taller de validación del diagnóstico socio ambiental y económico, elementos focales de manejo y mapeo de actores

Objetivo: Facilitar un proceso de participación local en el enriquecimiento de información y consolidación del documento Diagnóstico Socio ambiental y Económico de la Zona Protectora de los Cerros de Escazú y los Elementos Focales de Manejo identificados para esta ASP.

Fecha: Miércoles 29 de abril de 2015

Hora de inicio: 9am

Lugar: Municipalidad de San Ignacio de Acosta

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Antonio María Barboza	FUNDECOA	8343-8453	ajmbeto@hotmail.com
Priscila Caxante U	BAE-Palmichal	8706 0781	priscilacaxante@gmail.com.
Hermen Ramirez	ADESSARU	83534055	info@hacienda Pal...
Karla Arias Castro	grupo ecológico UNED Acosta	85886155	Karza_05@Hotmail.com
Claudia María Hidalgo	Grupo ecológico UNED Acosta	86443946	calau27h@hotmail.com
Adrián Fallas Cordero	Fundecoa	8324 7985	cuicketnat02@gmail.com
Carlos E Castro S	Colporrecio Lumaral	93 17 8760	tobasi126@hotmail.com,
Felipe Moreno Monge	Municipalidad Acosta	8547-12 19	gestionambientalacosta@gmail.com
Edgar Vindas Monge	ASADA San Luis Acosta	2410-1520	edgarvindasmonge@yahoo.es

Taller 2. Validación del Diagnóstico socio ambiental y económico, Elementos Focales de Manejo y Mapeo de Actores

07-05-2015

ASERRÍ

Actividad: Taller (6 horas de duración).
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento del Proyecto.
Facilitadores: Marco Hidalgo Chaverri y Adriana Fernández Sánchez.
Lugar: Municipalidad de Aserrí.
Día y Hora: jueves 7 de mayo de 2015 de 9am a 3pm.

Objetivo del Taller: Facilitar un proceso de participación local en el enriquecimiento de información y consolidación del documento Diagnóstico Socio ambiental y Económico de la Zona Protectora de los Cerros de Escazú (ZPCE) y los Elementos Focales de Manejo identificados para esta ASP.

Registro fotográfico

Lista de asistencia

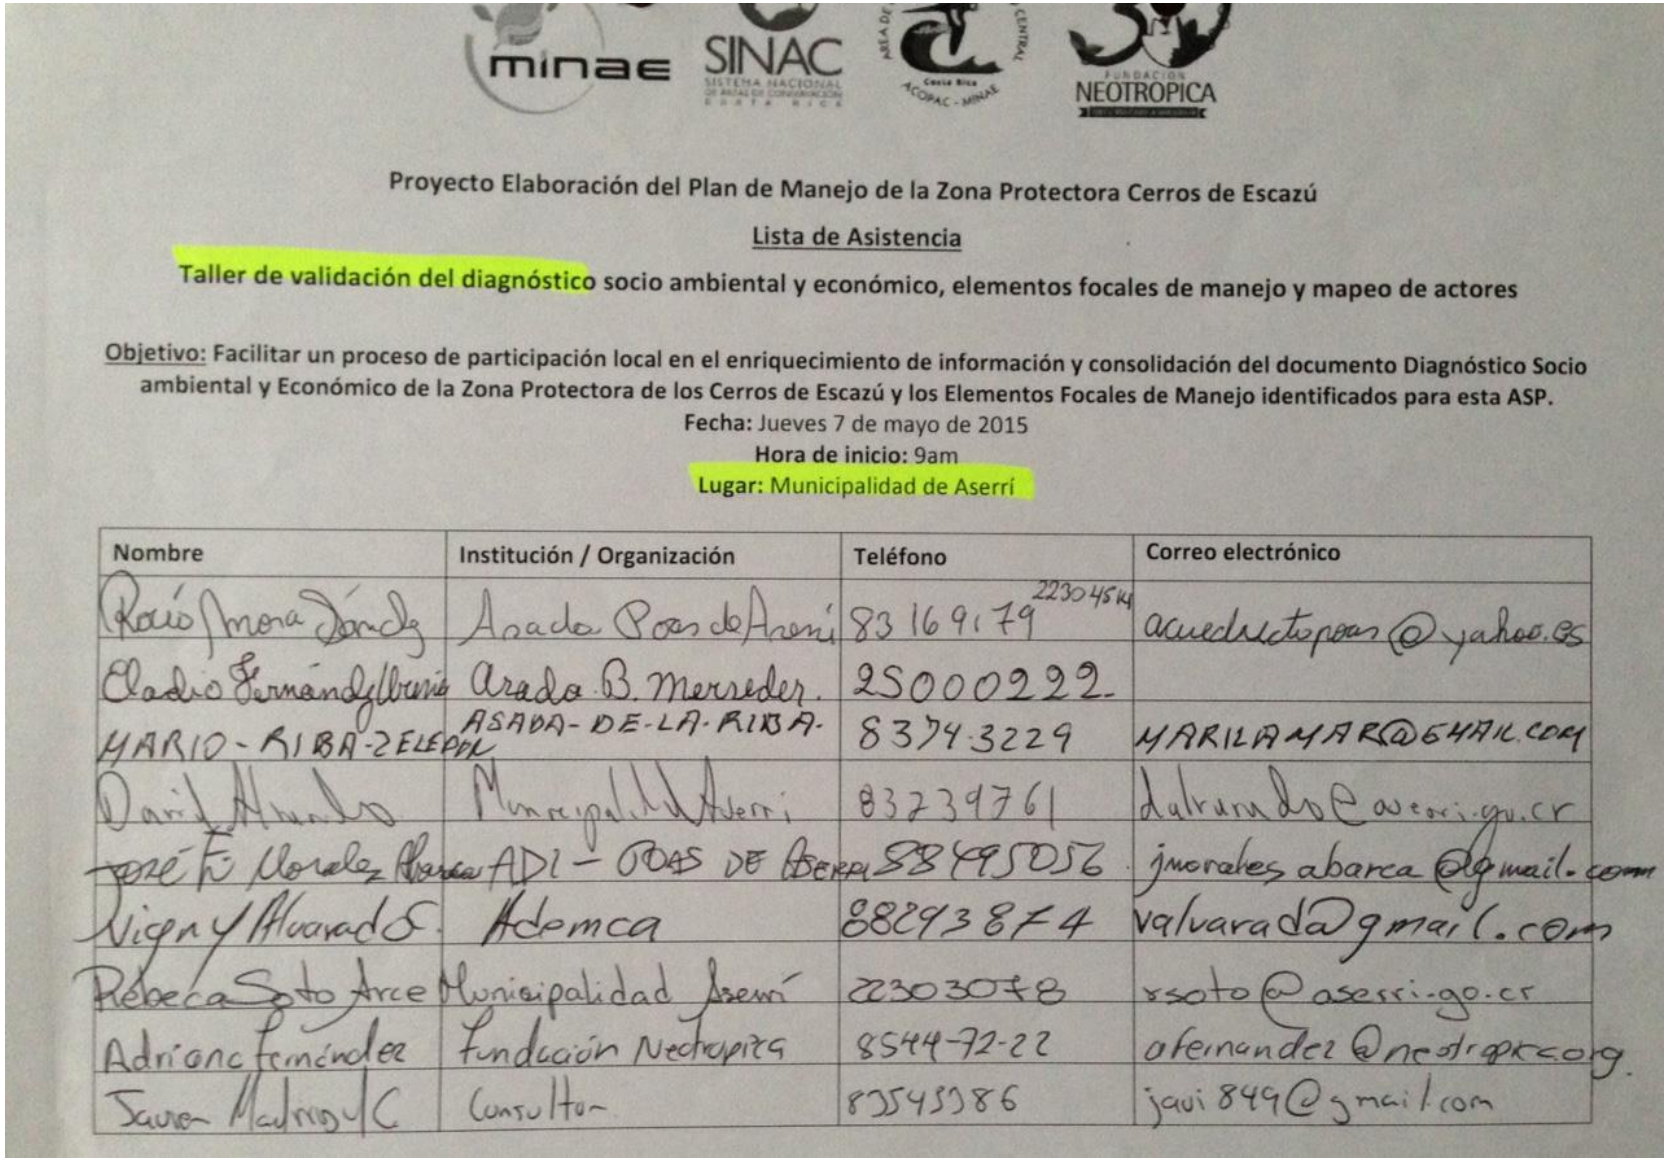

Proyecto Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Lista de Asistencia

Taller de validación del diagnóstico socio ambiental y económico, elementos focales de manejo y mapeo de actores

Objetivo: Facilitar un proceso de participación local en el enriquecimiento de información y consolidación del documento Diagnóstico Socio ambiental y Económico de la Zona Protectora de los Cerros de Escazú y los Elementos Focales de Manejo identificados para esta ASP.

Fecha: Jueves 7 de mayo de 2015

Hora de inicio: 9am

Lugar: Municipalidad de Aserrí

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Raúl Mora Jiménez	Asada Pozas de Aserrí	83169179 2230454	acueductopozas@yahoo.es
Eladio Fernández Ulloa	Arada B. Mercedes.	25000222.	
MARIO - RIBA - ZELEDÓN	ASADA-DE-LA-RIBA-	8374-3229	MARILAMAR@GMAIL.COM
David Alvarado	Municipalidad Aserrí	83739761	dalvarado@aserri.go.cr
José F. Morales Abarca	ADI – POAS DE ASERRÍ	88495056	jmorales.abarca@gmail.com
Vigny Alvarado S.	Ademca	88293874	valvarada@gmail.com
Rebeca Soto Arce	Municipalidad Aserrí	22303078	rsoto@aserri.go.cr
Adriana Fernández	Fundación Neotropica	8544-72-22	afernandez@neotropica.org
Javier Madrigal C.	Consultor	83545386	javi849@gmail.com

Proyecto Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Lista de Asistencia

Taller de validación del diagnóstico socio ambiental y económico, elementos focales de manejo y mapeo de actores

Objetivo: **Facilitar un proceso de participación local en el enriquecimiento de información y consolidación del documento Diagnóstico Socio ambiental y Económico de la Zona Protectora de los Cerros de Escazú y los Elementos Focales de Manejo identificados para esta ASP.**

Fecha: Jueves 7 de mayo de 2015

Hora de inicio: 9am

Lugar: Municipalidad de Aserrí

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Adina Astúa Garro	Municipalidad Aserrí	2230-3078	aastua@aserri.go.cr
Johanna Avila V	Municipalidad Alajuelita	70167002	johandreavila@gmail.com
Jorge L. Garbo06.	Saga -	83499649.	
Francisco Jorge Campos	Saga S.A.	8389-48-43	Francisjorge.20.67 CR.Com
Carlos Solano F	ASOC. TURISMO LA LEGUA	25400249	solano@cenecooa.cr

Taller 2. Validación del Diagnóstico socio ambiental y económico, Elementos Focales de Manejo y Mapeo de Actores

08-05-2015

SANTA ANA

Actividad: Taller (6 horas de duración).
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento del Proyecto.
Facilitadores: Marcia Carranza Vargas, Marco Hidalgo Chaverri y Adriana Fernández Sánchez.
Lugar: Salón comunal de Santa Ana.
Día y Hora: viernes 8 de mayo de 2015 de 9am a 3pm.

Objetivo del Taller: Facilitar un proceso de participación local en el enriquecimiento de información y consolidación del documento Diagnóstico Socio ambiental y Económico de la Zona Protectora de los Cerros de Escazú (ZPCE) y los Elementos Focales de Manejo identificados para esta Área Silvestre Protegida.

Registro fotográfico

Lista de asistencia

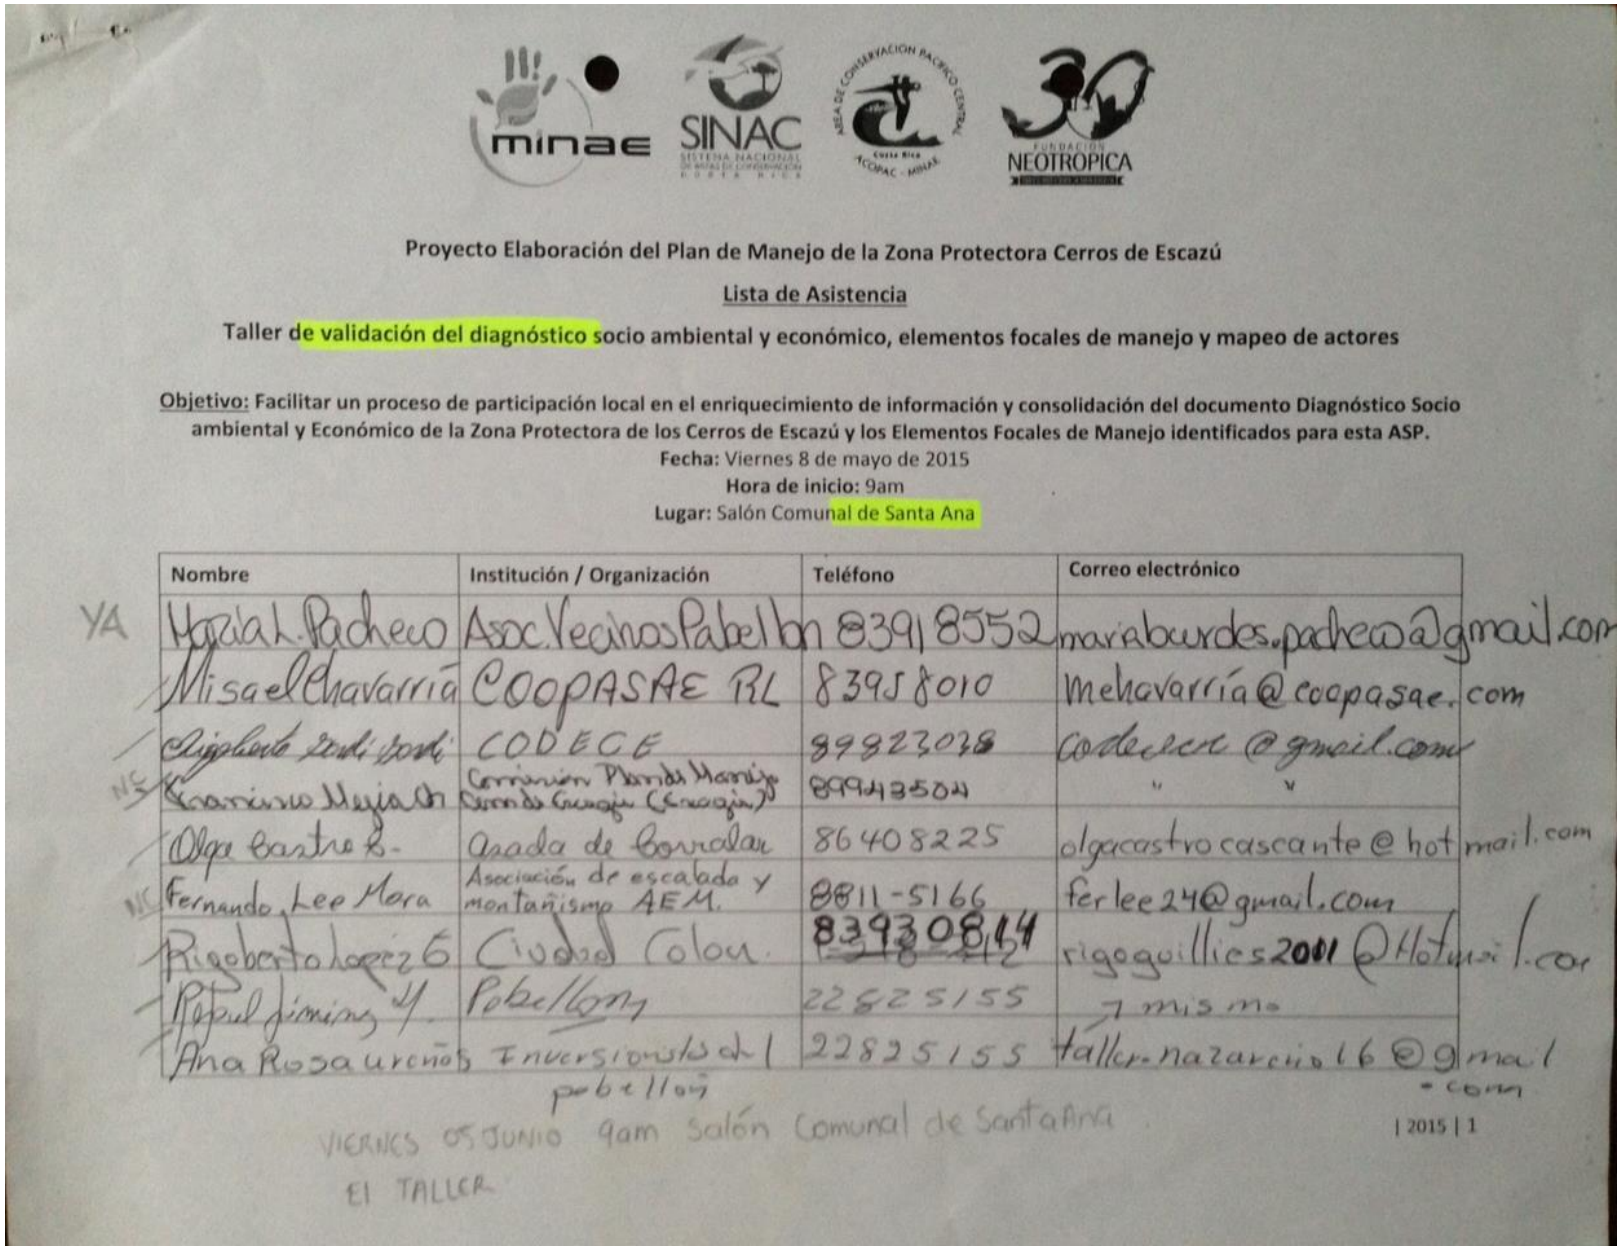

Proyecto Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Lista de Asistencia

Taller de validación del diagnóstico socio ambiental y económico, elementos focales de manejo y mapeo de actores

Objetivo: Facilitar un proceso de participación local en el enriquecimiento de información y consolidación del documento Diagnóstico Socio ambiental y Económico de la Zona Protectora de los Cerros de Escazú y los Elementos Focales de Manejo identificados para esta ASP.

Fecha: Viernes 8 de mayo de 2015

Hora de inicio: 9am

Lugar: Salón Comunal de Santa Ana

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
YA María L. Pacheco	Asoc. Vecinos Pabellón	8391 8552	mariabourdes.pacheco@gmail.com
Misael Chavarría	COOPASAE RL	8395 8010	mchavarría@coopasae.com
Alejandro Cordero	CODECE	89823038	codecece@gmail.com
NS Mariano Mejías	Comisión Plan de Manejo Cerros de Escazú (Cenac)	89943504	" "
Olga Castro S.	Asada de Bebedero	8640 8225	olgacastrocascante@hotmail.com
NC Fernando Lee Mora	Asociación de escalada y montañismo AEM.	8811-5166	ferlee24@gmail.com
Rigoberto López G	Ciudad Colón.	8393 0814	rigogoillies2001@Hotmail.com
Rafael Jiménez Y.	Pabellón	2282 5155	el mismo
Ana Rosa Ureña S	Inversiones de la Pabellón	2282 5155	taller.nazareno16@gmail.com

VIERNES 05 JUNIO 9am Salón Comunal de Santa Ana

EL TALLER

| 2015 | 1

Proyecto Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Lista de Asistencia

Taller de validación del diagnóstico socio ambiental y económico, elementos focales de manejo y mapeo de actores

Objetivo: Facilitar un proceso de participación local en el enriquecimiento de información y consolidación del documento Diagnóstico Socio ambiental y Económico de la Zona Protectora de los Cerros de Escazú y los Elementos Focales de Manejo identificados para esta ASP.

Fecha: Viernes 8 de mayo de 2015

Hora de inicio: 9am

Lugar: Salón Comunal de Santa Ana

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Erika Angulo C.	Municip de Mora	22491050 ext 108	controlconstructivo@mora.go.cr
Gritta Ajuro Alfaro	Municipalidad de Mora	87026534	gestionambiental@mora.go.cr
YA Hugo A. Vargas	Mora	85538789	
Aquiles Mena D.	Sabl Trad	88743972	Fax 2282 71 80/ahs.910@ [illegible]
// Alberto Mejía	Comun. Pabellón	87100975	
NC Lilliana Alvarez	UNCASO	8256-7470	unioncantu@gmail.com.
// Paulina Morales Alpízar	Centro Agrícola Cantonal de Santa Ana	87506869	Cacsa@ice.co.cr
// Henry Guillén	Mun. Santa Ana	88817862	hequille@gmail.com
// Fabio Ramírez B	Urbanizadora La Laguna Condominio Los Bambúes	8881-6177	~~[illegible]~~ Framirez@lalaguna.cr

Proyecto Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Lista de Asistencia

Taller de validación del diagnóstico socio ambiental y económico, elementos focales de manejo y mapeo de actores

Objetivo: Facilitar un proceso de participación local en el enriquecimiento de información y consolidación del documento Diagnóstico Socio ambiental y Económico de la Zona Protectora de los Cerros de Escazú y los Elementos Focales de Manejo identificados para esta ASP.

Fecha: Viernes 8 de mayo de 2015
Hora de inicio: 9am
Lugar: Salón Comunal de Santa Ana

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Rebeca Villalobos	Org. La Laguna	8377-3261	rvillalobos@lalaguna.cr
JORGE ROSS	PROPIETARIOS San Miguel	8817-4400	JROSS@GJEABOGADOS.COM
Ana del Carmen Gutiérrez	Propietario - Llano San Miguel	5100 6780	anadelcarmengutierrez@gmail.com
Diana Scaglietti	Bajo los Arcos y Pabellón	8301-4401	Diana Scaglietti
Gustavo A. Sauma Fonseca	Haciendas Monte Pollo del Sur	8384-3071	gsauma@saumabogados.com
Augusto Sanabria	vecino de Pabellón	88 29 17 17	AugPabellón@Hotmail.com
Manuela Lobo	Muni Santa Ana	87067594	melaporio@hotmail.com
CARLOS A. LAMAS	MUNI DE MORA.	87199615	asesoria legal@mora.go.cr.
Julio Bustamante	ACOPAC-SINAC	85800485	julio.bustam@gmail.com

Proyecto Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Lista de Asistencia

Taller de validación del diagnóstico socio ambiental y económico, elementos focales de manejo y mapeo de actores

Objetivo: Facilitar un proceso de participación local en el enriquecimiento de información y consolidación del documento Diagnóstico Socio ambiental y Económico de la Zona Protectora de los Cerros de Escazú y los Elementos Focales de Manejo identificados para esta ASP.

Fecha: Viernes 8 de mayo de 2015

Hora de inicio: 9am

Lugar: Salón Comunal de Santa Ana

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Lilliana Rubí Jiménez	ACOPAC-SINAC	2416-70-68 ext 115	lilliana.rubi@sinac.go.cr
Alex Ingnaly Segura	ACOPAC-SINAC	2416-78-78-	alex.ingnaly@sinac.go.cr
Helmut Johnson M.	Muni. Santa Ana	2582-7412	hjohnson@santaana.go.cr.
Miguel Mussmanni Quintana	Empresa Privada y Monte Pelado	88690351	Whatsapp.
Manuel Arley M	Empresa Privada	8389-7447	xyzarley@gmail.com
Andrea Montero C.	Asociación CR×S	2204-7351	amontero@costaricaporsiempre.org
Wilberth Jiménez G.	Propietario	8866 6975	wjimenez@racsa.co.cr
GERARDO ORTIZ C	MUNICIPALIDAD STA ANA	88363071	gortiz@santaana.go.cr.

Proyecto Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Lista de Asistencia

Taller de validación del diagnóstico socio ambiental y económico, elementos focales de manejo y mapeo de actores

Objetivo: **Facilitar un proceso de participación local en el enriquecimiento de información y consolidación del documento Diagnóstico Socio ambiental y Económico de la Zona Protectora de los Cerros de Escazú y los Elementos Focales de Manejo identificados para esta ASP.**

Fecha: Viernes 8 de mayo de 2015

Hora de inicio: 9am

Lugar: Salón Comunal de Santa Ana

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Freddy Fogueo	Divalco	2528-40-35	Fogueo@divalco.go.cr
Daniel Rojas N	Istmo Law, SA	8859-9511	daniel@istmolaw.com
Ricardo Vargas Sibaja	propietario	89503806 22329044	RVargasSibaja@gmail.com
Roberto Vargas S	Propietario	8324.6219	ROBEVASI@ghotl.com
Rebeca Vargas S.	propietario	83-75-94-57 22-20-25-22	rebe70@hotmail.com
Marco Hidalgo Chaverri	Fundación Neotrópica	2253-2130	mhidalgo@neotropica.org
Carole Brun	fundación Neotrópica	2253 - 2150	cbrun@neotropica.org
Marcia Carranza Vargas	Fundación Neotropica.	11	mcarranza@neotropica.org
Adriana Fernández	Fundación Neotropica.	8544-72-22	

Taller 3. Validación y construcción de Líneas de Acción del Plan General de Manejo para la Zona Protectora Cerros de Escazú

28-05-2015

ASERRÍ

Actividad: Taller (3 horas de duración).
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento.
Facilitadores: Marco Hidalgo, Adriana Fernández, Marcia Carranza
Lugar: Municipalidad de Aserrí
Día y Hora: jueves 28 de mayo 2015 de 9am a 12md.

Objetivo del Taller: Presentar y validar la propuesta de líneas de acción para el Plan de Manejo de la ZPCE, y recibir retroalimentación por parte de los asistentes.

Registro fotográfico

Lista de participantes

Lista de Asistencia

Taller de Presentación de Líneas de Acción de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Objetivo: Presentar y validar con los participantes la propuesta de líneas de acción de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Fecha: Jueves 28 de mayo de 2015
Hora de inicio: 9:00am
Hora de cierre: 11 am
Lugar: Municipalidad de Aserrí

	Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico	
1	MARIO RIBA	AYA-DE-LA-RIBA	8374.3229	INFO@ASADADELARIBA.COM	✓
2	Raúl Mora	Asada de Pozos Aserrí	83169179	acueductopozos@yahoo.es	NC
3	Francisco Hernández V.	ASADA Pozos de Aserrí	2230-4514/8768-6071	acueductopozos@yahoo.es	✓
4	Sergio Feoli B.	CNFL	22951796	sfeoli@cnfl.go.cr	✓
5	Rodolfo María Fernández	Asada Barrio Merced Aserrí	25000222	asadalamerced@ymail.com.	✓
6	Eladio Fernández Herrera	" " "	" "	" " " "	✓
7	Vigny Alvarado C.	ADEMCA	88293874	valvarad@gmail.com	✓
8	Juan José Castro K.	MAG/Aserrí	22306211	jjcastro@mag.go.cr	✓
9	Alison Reyes Vindas	Municipalidad de Alajuelita Asociación Campanas	72746048	alisgrv@hotmail.com.	NC

Lista de Asistencia

Taller de Presentación de Líneas de Acción de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Objetivo: Presentar y validar con los participantes la propuesta de líneas de acción de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Fecha: Jueves 28 de mayo de 2015
Hora de inicio: 9:00am
Hora de cierre: 11 am
Lugar: Municipalidad de Aserrí

	Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico	
10	Johana Avila Vargas	Muni Alajuelita	70167002	johandreavila@gmail.com	JC
	Alex Brenes Soto	MINAE-SINAC-ACOPAC	60402205	alex.brenes@sinac.go.cr	AC
	Sergio Vargas Gómez	MINAE-SINAC-Acopac.	2416 6576 C-50916 15	sergio.vargas@sinac.go.cr	✓
	Francisco Jiménez	MINAE-SINAC-ACOPAC	24167968 ext 125	francisco.jimenez@SINAC.go.cr.	
	Javier Madrigal C.	Consulto-	85545386	javi849@gmail.com.	CV
	Rolando Jiménez	Municipalidad Aserrí	88844733	rjimenez@aserri.go.cr	✓
	David Marcucho	Municipalidad Aserrí	83239761	dmarcucho@aserri.go.cr	✓
	Jose F. Morales A.	ADI-Poás	88495056	jmoralesaborca@gmail.com	

Taller 3. Validación y construcción de Líneas de Acción del Plan General de Manejo para la Zona Protectora Cerros de Escazú

29-05-2015

ACOSTA

Actividad: Taller (3 horas de duración).
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento.
Facilitadores: Marco Hidalgo, Adriana Fernández, Marcia Carranza
Lugar: Escuela Cristóbal Colón, Acosta
Día y Hora: viernes 29 de mayo 2015 de 9am a 12md.

Objetivo del Taller: Presentar y validar la propuesta de líneas de acción para el Plan de Manejo de la ZPCE, y recibir retroalimentación por parte de los asistentes.

Registro fotográfico

Lista de Asistencia

Taller de Presentación de las Líneas de Acción: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Objetivo: Presentar y validar con los participantes la propuesta de líneas de acción de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Fecha: Jueves 29 de mayo de 2015
Hora de inicio: 9:00am
Hora de cierre: 12:00pm
Lugar: Municipalidad de San Ignacio de Acosta

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Claudia Mora Hidalgo	Grupo ecológico UNED Acosta	86443946	c_l_a_u27h@hotmail.com
Karla Arias Castro	Grupo Ecológico UNED Acosta	85586155	karza_05@Hotmail.com
Felipe Moreno Yorge	Munic Acosta	24100186 ext 111	gestionambientalacosta@gmail.com.
Olman Vargas S	Asoc. La Pas. San Pablo	8363-8728	olman vargas@Hotmail.com
Cindy Blanco Muñoz	INA	83659939	cblancomunoz@ina.ac.cr.
Aly Fridy Sáiz	MINAE SINAC-ACOPAC	60402205	aly.fridy@sinac.go.cr
Sergio Vargas Gómez	MINAE. SINAC - ACOPAC - OSRP.	Ti. 24166576 C-50091613	sergio.vargas@sinac.go.cr
Adriana Fernández	Fundación Neotropica	8594-72-22	afernandez@neotropica.org.
Marcia Carranza V	Fundación Neotrópica	2253-2130	mcarranza@neotropica.org.

Lista de Asistencia

Taller de Presentación de las Líneas de Acción: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Objetivo: Presentar y validar con los participantes la propuesta de líneas de acción de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Fecha: Jueves 29 de mayo de 2015
Hora de inicio: 9:00am
Hora de cierre: 12:00pm
Lugar: Municipalidad de San Ignacio de Acosta

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Marco Hidalgo Chaverri	Fundación Neotropica	2253-2031.	mhidalgo@neotropica.org

Taller 3. Validación y construcción de Líneas de Acción del Plan General de Manejo para la Zona Protectora Cerros de Escazú

05-06-2015

SANTA ANA

Actividad: Taller (3 horas de duración).
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento.
Facilitadores: Marco Hidalgo, Adriana Fernández, Marcia Carranza
Lugar: Salón Comunal de Santa Ana
Día y Hora: viernes 5 de junio de 2015 de 9am a 12md.

Objetivo del Taller: Presentar y validar la propuesta de líneas de acción para el Plan de Manejo de la ZPCE, y recibir retroalimentación por parte de los asistentes.

Registro fotográfico

Lista de participantes

Actividad:	**Taller de validación y construcción de la líneas de acción del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú**
Proyecto:	**Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú**
Lugar:	Salón Comunal, Santa Ana
Fecha:	05/06/2015
Objetivo	Validar y construir en conjunto con los actores acreditados las líneas de acción del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Nombre	Institución	Contacto	Firma
Juan Carlos Rodríguez	MAG Santa Ana	22822116	
Misael Chavarría J	COOPASAE	83958010	
Alejandro Gonzalez Gonz	CODECE	89822038	
José Francisco Nieja Ch	Comisión Bomba Manejo	89943504	
Marco Bien Castro	Vecino	6046-5468 / marco.bien@gmail.com	
José Manuel Alpízar Sáenz	Asesores del Valle	22827846 - 87049475	jmachpizar@asesoresdelvalle.com
Jody Winer y Mark Shaw	propietario	2203-2375; 8365-1056	
Paulina Morales Alpízar	Centro Agrícola Cantonal de Sta Ana	22825986 / 87506869 cacsa@ice.go.cr	
Alex Angulo Sáenz	MINAE-ACOPAC	6064022-05	

Actividad:	**Taller de validación y construcción de la líneas de acción del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú**
Proyecto:	**Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú**
Lugar:	Salón Comunal, Santa Ana
Fecha:	05/06/2015
Objetivo	Validar y construir en conjunto con los actores acreditados las líneas de acción del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Nombre	Institución	Contacto	Firma
Olga Castro C.	Asada Corralar	86408225 2418-81-61	Olga Castro C
Augusto Fernández Z	vecino Pabellón	86291717	
Ana Rosa Urena S.	Inversionistas	22825155	
GIOVANNI FONSECA	del pabellon VECINO QUITIRRISI MORA/LA TRINIDAD	7075-7780	
Rafael Jiménez Hernandez	Inversionistas	22825155	
Maria Padeco	Pabellón	83918552	
Miguel Musmanni	Pabellón	88690351	
Manuel Arley M.	Pinadora.	8389-7447	M. Arley M

Actividad:	**Taller de validación y construcción de la líneas de acción del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú**
Proyecto:	**Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú**
Lugar:	Salón Comunal, Santa Ana
Fecha:	05/06/2015
Objetivo	Validar y construir en conjunto con los actores acreditados las líneas de acción del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Nombre	Institución	Contacto	Firma
Rebeca Villalobos Jiménez	La Laguna	rvillalobos@lalaguna.cr	
Rigoberto López G	Propietario Mora	rigoguillen2011@Hotmail.com	
Ana del C. Gutiérrez M	Propietario-Escazu	anadelcarmengutierrez@gmail.com	
Amado Soler González	Propietario Escazú	amadosolerg@Hotmail.com	
Mario Barba F	Propietario Escazú	Mario Barba F.@j.mus.cl.com	
Carolina Elizondo U	Propietario	mcelizondou@gmail.com	
Efraín Monge Hdez	ACOPAC-OSRP	efrainmonge@yahoo.es	
Marco V. Araya B	SINAC-ACLAS	marco.araya@sinac.go.cr	

Actividad:	**Taller de validación y construcción de la líneas de acción del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú**
Proyecto:	**Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú**
Lugar:	Salón Comunal, Santa Ana
Fecha:	05/06/2015
Objetivo	Validar y construir en conjunto con los actores acreditados las líneas de acción del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Nombre	Institución	Contacto	Firma
David Vélez Matamoros	Municipalidad de Mora	asistentelegal@mora.go.cr	
Erika Angulo Campos	Municipalidad de Mora	ambdesconstructivo@mora.go.cr	
Priscilla Vargas G.	Municipalidad de Mora	informaciongeografica@mora.go.cr	
Carlos Zamora Quesada	Municipalidad Mora	asesorialegal@mora.go.cr	
WILLIAM ARCE M.	MUNI DE MORA	will.arce@mora.go.cr	
GRETEL AGÜERO ALVARADO	MUNI MORA	gestionambiental@mora.go.cr	
Luis M. Guzmán Rodríguez	Munic. Puriscal	luguzmanm84@hotmail.com	
Henry Guillén Tiado	Mun. Santa Ana	hequille@gmail.com	

Actividad:	**Taller de validación y construcción de la líneas de acción del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú**
Proyecto:	**Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú**
Lugar:	Salón Comunal, Santa Ana
Fecha:	05/06/2015
Objetivo	Validar y construir en conjunto con los actores acreditados las líneas de acción del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Nombre	Institución	Contacto	Firma
Fulvia Wohl	ACOPAC	2416-7068	
MARIO RIBA	AYA-DE-LA-RIBA PACHICHAC	83743229	
Gerardo Chaverri	Acopac	83093437	
Roxana Fonseca J.	Dirodec	25284030	
Fabby Esquivel	Ecam	2528-40-35	
Alfonso Duarte M.	SINAC-ACOPAC	24167068 Ext 111	
JORGE ROSS ARAYA	PROF. PENAS BLANCAS	2234-8889	
Irene Zamora C.	SENARA	22579733	
ROBERTO RAMIREZ	SENARA	22579733	

Gilberto Monge Pizarro Alcalde Mora alcalde@mora.go.cr 88141505
Gerardo Quesada Espinoza CC 14 Santa Ana gquesada@santaana.go.cr

Taller 4. Presentación de la Zonificación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

28-08-2015

ACOSTA

Actividad: Taller (2 horas de duración).
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento.
Facilitadores: Marco Hidalgo, Adriana Fernández, Marcia Carranza
Lugar: Municipalidad de Acosta
Día y Hora: 28 de agosto 2015 de 2pm a 4 pm

Objetivo del Taller: Presentar la propuesta de zonificación del Plan de Manejo de la ZPCE, y recibir retroalimentación por parte de los asistentes.

Registro fotográfico

Lista de Asistencia a actividad: Taller de Presentación de la Zonificación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Fecha: 28 agosto de 2015
Hora de inicio: 2:00 am
Lugar: Municipalidad de Acosta

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Olman Ureña S.	Asoc. San Pablo - Palmar	8363 8728	olmanurena2@hotmail.com
Felipe Moreno M	Munic. Acosta	2410-0186	vgaacosta@gmail.com
Gurselle Monge S.	Munic Acosta	2410-0186	municbienesinmuebles@gmail.com
Gerardo Chavarría	ACOPAC	8309 7433	gerardo.chavarria@gmail.com
Adriana Fernández	Fundación Neotrópica	~~8845 9622~~ 2253-2115 ext 30	afernandez@neotropica.org
Marcio Carranza V	Fundación Neotrópica	2253-2115	mcarranza@neotropica

Taller 4. Presentación de la Zonificación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

28-08-2015

ASERRÍ

Actividad: Taller (3 horas de duración).
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento.
Facilitadores: Marco Hidalgo, Adriana Fernández, Marcia Carranza
Lugar: Municipalidad de Aserrí
Día y Hora: 28 de agosto 2015 de 9am a 12 md.

Objetivo del Taller: Presentar la propuesta de zonificación del Plan de Manejo de la ZPCE, y recibir retroalimentación por parte de los asistentes.

Registro fotográfico

Lista de Asistencia a actividad: Taller de Presentación de la Zonificación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Fecha: 28 agosto de 2015
Hora de inicio: 9:00 am
Lugar: Municipalidad de Aserrí

	Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
1	Vigny Alvarado	ADEMCA	8829-3874	valvarad@gmail.com
2	DANIEL MONGE	Arquitecto	83634710	dmbosque@yahoo.com
3	Cindy Blanco Muñoz	INA	83659939	cblancomunoz@ina.ac.cr
4	Rocío Mora	Acueducto Poas	83169179	
5	[illegible]	[illegible]	22306211	jcastro@coopeva.go.cr
6	Fran Hernández B.	Acueducto Rural Poas	89354357	
7	Gerardo Chaverri	ACOPAC	83093432	gerardo.chaverri@sinac.go.cr
8	David Alvarado R	[illegible]	83239761	dalvarado@ademi.go.cr
	Marcia Carranza V	Fundación Neotrópica	2253-21 80	mcarranza@neotropica.org.
	Adriana Fernández	Fundación Neotrópica	~~88459622~~ 2253-21-30	

Taller 4. Presentación de la Zonificación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

01-09-2015

ASERRÍ

Actividad: Taller (4 horas de duración).
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento.
Facilitadores: Marco Hidalgo, Adriana Fernández, Marcia Carranza
Lugar: Centro Corporativo Jorge Volio
Día y Hora: 01 setiembre 2015 de 9am a 1 pm.

Objetivo del Taller: Presentar la propuesta de zonificación del Plan de Manejo de la ZPCE, y recibir retroalimentación por parte de los asistentes.

Registro fotográfico

Lista de asistencia

Lista de Asistencia a actividad: Taller de Presentación de la Zonificación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Fecha: 1 setiembre de 2015

Hora de inicio: 9:00 am

Lugar: Centro Corporativo Jorge Volio, Santa Ana

	Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
1	Raul Marin Fernández	UTN/IGA	86031764	mraulm88@hotmail.com
2	Ana del Carmen Gutiérrez	Propietaria	8381 5731	anadelcarmengutierrez@gmail.com
3	Hugo Sloja	Propietario	85538789	
4	Sergio Zamora C.	Propietario	70703274	sergio.zamoracastro@gmail.com
5	Gerardet Villalobos M.	Municipalidad Escazú	22087500	gestionurbana@escazu.go.cr
6	Helmut Johnson M.	Muni. Santo Ana	2582-7437	hjohnson@santoana.go.cr
7	Alejandro Bonilla	CODECE	89823078	
8	José Fco. Mejía G.	Asoc. del Barrio	89943504	x
9	Ana Rosa Ureña S	Inversiones del pobelto	87239840	taller.nazareno16@gmail.com
10	Rafael Jiménez M.	Talleres San del Pobelto	83638593	taller.nazareno16@gmail.com
11	Marcela Alfaro	CRUCE DEL MONTE	88482277	marcela@cruzdelmonte.com
12	Manuel Arley	Amigos del Sur	8389-7447	xyzarley@gmail.com
13	Daniel van Wilpe	"	8384-7575	danielvanwilpe@gmail.com

Lista de Asistencia a actividad: Taller de Presentación de la Zonificación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Fecha: 1 setiembre de 2015

Hora de inicio: 9:00 am

Lugar: Centro Corporativo Jorge Volio, Santa Ana

	Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
14	Julia van Wilpe	Propietario Arq.	22827575	jvjvanwilpe@gmail.com
15	Freddy Oquero	Fundeco	2528-70-35	Foquero@fundeco.go.cr
16	Ana. Fernandez	Aso. Barrio Los Angeles	88801273	ana-fernandezvargas@hotm-
17	Olga Castro C.	Asada Corralar	8640 82 25	olgacastrocascante@hotmail.com
18	Olga Maria C.	Asada Corralar	84-09-72-74	
19	Maria L. Pacheco	Asoc. Vecinos Pabellón	83-91-85-52	marialourdes.pacheco@gmail
20	AMADO JOSE E.	Prop. Ingeniero Agr.	2228-0290.	amadosleng@Hotmail.com
21	Rigoberto Jo	Propietario	8393 0819.	rigoguillies 2011@Hotm.
22	Paulina Morales A.	Cacsa Centro Ag. Cant. Alajuela	8750 6869	cacsa@ice.co.cr.
23	Audrey Esquivel	Contacto alcalde	5702 8623	audrey10@yahoo.es
24	Gerardo Chaves	ACOPAC	83093437	gerardo.chaves@fundeco
25	Miguel Mussmanni Quintero	Monte Petos	88690351	WhatsApp
26	Gretel Azofeifa Alfaro	MUNI MORA	87026534	gestionambiental@mora.go.cr

Lista de Asistencia a actividad: Taller de Presentación de la Zonificación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Fecha: 1 setiembre de 2015

Hora de inicio: 9:00 am

Lugar: Centro Corporativo Jorge Volio, Santa Ana

	Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
27	Erika Angulo Campos	Municip Mora	2249 1050 ext 108	controlconstructivo@mora.go.cr
28	Priscilla Vargas G	Municipalidad Mora	2249-1050 ext: 116	informacion geografica @mora.go.cr
29	Roberto Leiva.	Mora.	83838528.	roberto leiva prop@gmail.com
30	Henry Guillen	MUSA muni Santa	88817862	hegville@gmail.com
31	Fabio Ramirez	ULSA	8881-6177	framirez@lalaguna.cr
32	Rebeca Villalobos	ULSA	8877-3261	rvillalobos@lalaguna.cr
33	Andrea Montero C.	ASOC CRxJ	2004-7550	amontero@costaricaporsiempre.org
34	José María Jiménez B	A&A. Stos Mts MAG	22822116	jjimenez6@mag.go.cr
35	Norma Vargas	Asoc. Vecinal Pueblo	70766680	VENUSERACSA.CO.CR
36	JORGE ROSS		8817-4400	JROSSCG@ABOGADOS.COM
37	Alfonso Duarte M	SINAC-ACOPAC	87091085	alfonso.duarte@sinac.go.cr
38	Gerardo Arauz	Municipalidad de Santa	88363071	gquesada@santaana.go.cr
39	Margarita Lobo	Municip. Sta Ana	87067594	melamorro@hotmail.com

Lista de Asistencia a actividad: Taller de Presentación de la Zonificación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú

Fecha: 1 setiembre de 2015

Hora de inicio: 9:00 am

Lugar: Centro Corporativo Jorge Volio, Santa Ana

	Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
40	Patricia Segovia Ruiz	Asociación de desarrollo	22827362	pspatricia370@gmail.com
41	Jose V. Salazar P.	Vecino.	87827718	jofravial@ymail.com
42	Carlos Landas	Municipal	87446615.	asesorialegal@ava.go.cr
43	Luis Arrieta Abellon	Vecino	8843-5471	ldarretaa@hotmail.com
44	Geraldine Gutierrez	Vecino	86345289	degutierrez3049@hotmail.com
45	Javier Madrigal	———	85545586	javi849@gmail.com
46	Rebeca Vargas Sibaja	propiedad	83-75-94-57	[illegible]70@hotmail.com
47	Ricardo Vargas Sibaja	propiedad.	89503806	RVargasSibaja@gmail.com
48	Marcia Carranza V	Fundación Neotrópica	2253-2130	mcarranza@neotropica.org

Taller 5. Presentación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
06-10-2015
ACOSTA

Actividad: Taller (3 horas de duración).
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento.
Facilitadores: Marco Hidalgo, Adriana Fernández
Lugar: Municipalidad de Acosta
Día y Hora: 06 de octubre 2015 de 9 am- 12md

Objetivo del Taller: Presentar y validar el documento "Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú" y recibir retroalimentación por parte de los participantes.

Registro fotográfico

Lista de asistencia

Lista de Asistencia

Taller de Presentación y Validacióndel Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Objetivo: Presentar y validar con los participantes la propuesta de Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Fecha: Martes6 de octubre de 2015
Hora de inicio: 9:00am
Hora de cierre: 12:00pm
Lugar: Municipalidad de San Ignacio de Acosta

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
MARIO - RIBAS	FUNDACION JORGE ZELEDON - AYA RIBAS	83 79 3229	MARILAMAR@GMAIL.COM
Lilliana Rubi Jiménez	SINAC - ACOPAC	2416-70-68	lilliana.rubi@sinac.go.cr
Heriberto Urena Giddens	MIDEPLAN R.C.	84920227	heriberto.urena@mideplan.go.cr
Eugenia Megen Bolaños	Comunidad Acosta	8543-7297	eugenia.megen@gmail.com
Edna Chacón Barrantes	Red de Mujeres Nacientes	84666854	edna.chacon77@hotmail.com
Ligia Hadina Marin Padilla	Red de Mujeres Nacientes	85150649	ligiadiram@hotmail.com
Hermes Ramirez	ADESSARU	83534055	hermesmcr@mcr.cr
Germán Monge Arguedas	Bandera Azul Ecológica	56274586	
Olman Ulloa S	Asoc. Des. San Ig. Ac.	8363-8778	
Jessi Ma Murillo T	Monitores salud	2410-01-49	Jomurillo monitores salud
Roxana Trejos Ureña	ASADA-Palmichal-Cuesta Blanca	87447913	roxa200@gmail.com
Felipe Moreno Monge	Municipalidad Acosta	24100186	uga.acosta@gmail.com
Cindy Blanco Muñoz	MINAE-SINAC-ACOPAC	2416-78-78 / 83659939	cblancomunoz@sinac.go.cr

Taller 5. Presentación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
06-10-2015
ASERRÍ

Actividad: Taller (3 horas de duración).
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento.
Facilitadores: Marco Hidalgo, Adriana Fernández
Lugar: Municipalidad de Aserrí
Día y Hora: 06 de octubre 2015 de 2pm a 5pm

Objetivo del Taller: Presentar y validar el documento "Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú" y recibir retroalimentación por parte de los participantes.

Registro fotográfico

Lista de asistencia

Lista de Asistencia

Taller de Presentación y Validacióndel Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Objetivo: Presentar y validar con los participantes la propuesta de Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Fecha: Martes6 de octubre de 2015
Hora de inicio: 2:00am
Hora de cierre: 5:00pm
Lugar: Municipalidad de Aserrí

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Omaris Jara Santos	Personal	8674250	Comunicando por Jigueca@gmail.com
Denia Zúñiga V	Muni. Aserrí	22303078	dzuniga@aserri.go.cr
JORGE CAMACHO R	ASEMCA	83965911	JORYEC@ZOEXER.COM
Frankl in Hernández Solano	A.C.R. Pozas de Aserrí	89359353	
Juan José Castro Rojas	MAG/Aserrí	22306211	jcastro@mag.go.cr.
Adolfo María Fernández	Oficial Municipal	85000222	oficialmunicipal@gmail.com
Rodio Fernández Ureña	11 11	85000222	oficialmunicipal@gmail.com
Jorge Enrique Morales Alfaro	ADI-ROAS	88495056	jmoralesalfaro@gmail.com
Ally Mejías Sáez	MINAE - Aserrí	24167878	Ally.mejias@sinac.go.cr
Adriana Fernández	Fundación Neotrópica	8544-7222	afernandez@neotropica.org

Taller 5. Presentación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
08-10-2015
SANTA ANA

Actividad: Taller (3 horas de duración).
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento.
Facilitadores: Marco Hidalgo, Marcia Carranza, Adriana Fernández
Lugar: Centro corporativo Jorge Volio, Santa Ana
Día y Hora: 08 de octubre 2015 de 9 am- 12md

Objetivo del Taller: Presentar y validar el documento "Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú" y recibir retroalimentación por parte de los participantes.

Registro fotográfico

Lista de asistencia

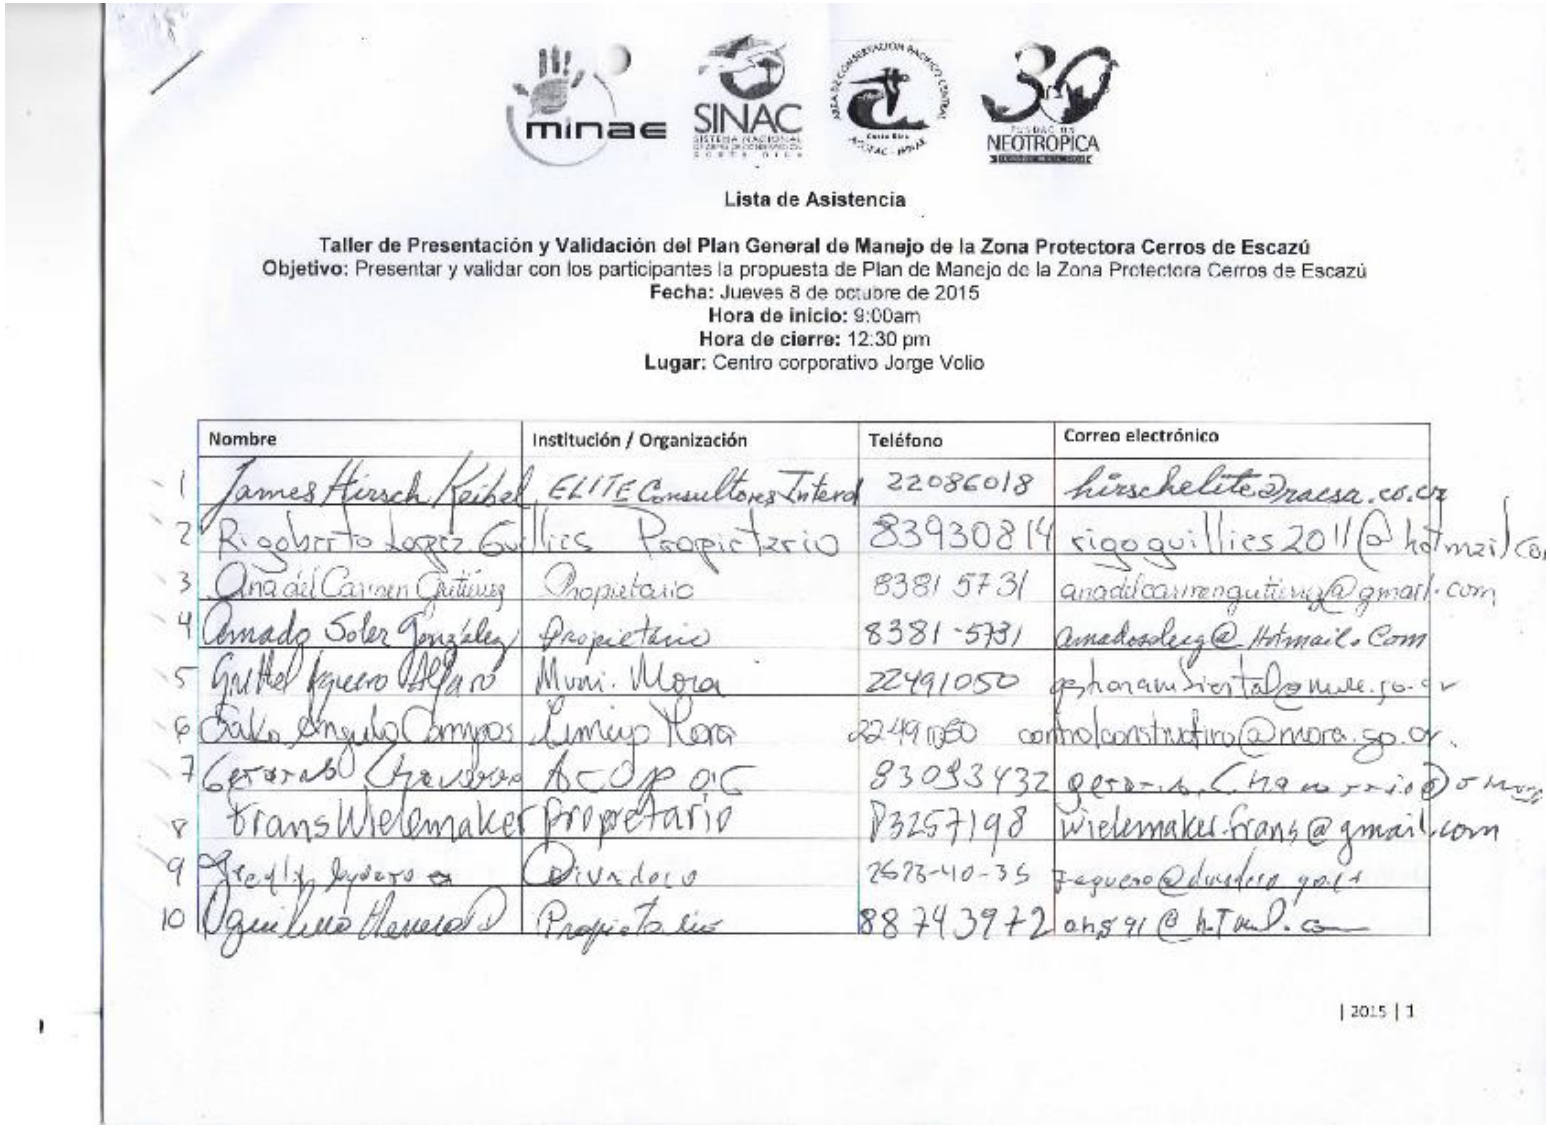

Lista de Asistencia

Taller de Presentación y Validación del Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Objetivo: Presentar y validar con los participantes la propuesta de Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Fecha: Jueves 8 de octubre de 2015
Hora de inicio: 9:00am
Hora de cierre: 12:30 pm
Lugar: Centro corporativo Jorge Volio

	Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
1	James Hirsch Keibel	ELITE Consultores Interd	22086018	hirschelite@racsa.co.cr
2	Rigoberto Lopez Guillies	Propietario	83930814	rigoguillies2011@hotmail.co
3	Ana del Carmen Quirós	Propietario	8381 5731	anadelcarmenquiros@gmail.com
4	Amado Soler González	Propietario	8381-5731	amadosoleg@Hotmail.com
5	Gustavo Iguero Alfaro	Muni. Mora	22491050	gustavoiguero@mora.go.cr
6	Carlos Angulo Campos	Municipalidad Mora	22491050	carlosconstructora@mora.go.cr
7	Gerardo Chaverri	ACOPAC	83093432	gerardo.chaverri@yahoo.com
8	Frans Wielemaker	propietario	83257198	wielemaker.frans@gmail.com
9	Gerardo Iguero	Divadeco	2673-10-35	giguero@divadeco.com
10	Guillermo Herrera	Propietario	88743972	ans91@hotmail.com

Lista de Asistencia

Taller de Presentación y Validación del Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Objetivo: Presentar y validar con los participantes la propuesta de Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Fecha: Jueves 8 de octubre de 2015
Hora de inicio: 9:00am
Hora de cierre: 12:30 pm
Lugar: Centro corporativo Jorge Volio

	Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
11	Gary Lombardi	Propietario	8831-4111	plombardi77@gmail.com
12	Paola Prado	Propietaria	8831-4111	plombardi77@gmail.com
13	Rainer Mora V.	Asesor desarrollo Predial	2282 9473	morarainer@gmail.com
14	Julia van Wilpe	PROPIETARIA	2282 7577	jrgvanwilpe@gmail.com
15	Henry Madrigal Cordero	Asociación de Desarrollo Integral de Propiedades	22824991	hmadrigalc@yahoo.com.mx
16	Gonzalo Aguilar	Asociación de Desarrollo	2-40128	
17	Fabio Ramírez	Urbanizadora La Laguna	8881-6177	Framirez@lalaguna.cr
18	Danilo Monge	11 ↗	8363-4710	dmonge@lalaguna.cr
19	Manuel Ant. Arley M	New count Investment	8389-7447	xyzarley@gmail.com
20	Priscilla Venegas C	Mun. de Mora	86168783	informacionegeografica@mora.go.cr

Lista de Asistencia

Taller de Presentación y Validación del Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Objetivo: Presentar y validar con los participantes la propuesta de Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Fecha: Jueves 8 de octubre de 2015
Hora de inicio: 9:00am
Hora de cierre: 12:30 pm
Lugar: Centro corporativo Jorge Volio

	Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
21	MARCELO ALEGRA	PROPIETARIO	87057802	GOODLIFECR@GMAIL.COM
22	Rafael Angel Jimenez Y	Propietario.	2282 5155	
23	Ana Rosa Reñas.	Propietaria	2282 5155	talleresarazamora16@gmail.com
24	MARIO · RIBA · ZELEDON	FUNDACION JORGE ZELEDON	8374-3229	MARILAMAR@6MAIL.COM
25	Paulina Morales Alpízar	Centro Ag. Cantonal de Santa Ana	87506869	Cacsa@ice.co.cr
26	María L. Padilla	Asoc. Vecinos Pabellón	83-91-85-52	maria.lourdes.padilla@gmail.
27	Maylin Chamorro Obregón	ASOC. CODECE	8805-2928	codececr@gmail.com.
28	Hugo Chaves Jara		88538759	
29	Helmuth Johnson M.	Muni. Santa Ana	8316 3712	hjohnson@santaana.go.cr.
30	Gerardo Víquez Esquivel	Muni Desamparados	22173575	gviquez@desamparados.go.cr

Lista de Asistencia

Taller de Presentación y Validación del Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Objetivo: Presentar y validar con los participantes la propuesta de Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Fecha: Jueves 8 de octubre de 2015
Hora de inicio: 9:00am
Hora de cierre: 12:30 pm
Lugar: Centro corporativo Jorge Volio

	Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
31	Olga Castro B	Asada Corralar	86408225	olgacastrocasante@hotmail.com
32	Yessenia Sánchez G	ASADA Corralar	87989361	yesisanchez26@hotmail.com
33	CARLOS LANGS	PROCURADURÍA JURÍDICA MINAE	87194615	asesorlegal@minae.go.cr.
34	Leonardo Ocrido E	Municipalidad de Santa Ana	88363071	pocrido@santaana.go.cr.
35	Audrys Esquivel	Concejo de Santa Ana - Candidato Alcalde	87093783	audrys10 6 Yahoo.es
36	Fulvia Wohl	ACOPAC	8345-8678	fulvia.wohl@sinac.go.cr
37	Henry Guell	Municipalidad Santa Ana	8881 7862	heguell@gmail
38	Jorge Rendón Gallego	Santa Ana News.	72.07.28.38	santaananews@gmail.com.
39	Norma Vargas	Asociación Pueblo	7076 6680	VENNAGRACA.CO.CR
40	Sergio Fonli B	CNFL	2295 7474	S. Fonli sfonli@cnfl.go.cr

Lista de Asistencia

Taller de Presentación y Validación del Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Objetivo: Presentar y validar con los participantes la propuesta de Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú
Fecha: Jueves 8 de octubre de 2015
Hora de inicio: 9:00am
Hora de cierre: 12:30 pm
Lugar: Centro corporativo Jorge Volio

	Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
41	Humberto Brenes	Propietario	8070-1212	HUMBERTOBRENES@GMAIL.CO
42	Mauren Barquero	CIE Santa ana	83371050	mbarquero@ciencostarica.com
43	Karla Apestiguí	Arquitecta	83413494	kapestegui@gmail.com
44	Wilberth Jiménez	Propietario	8866975	wjimenez@racsa.co.cr.
45	Oscar Núñez Calvo	Aura de Sol	88246841	oñonecr@gmail.com
46	Alfonso Duarte M	SINAC ACOPAC	87091085	alfonso.duarte@sinac.go.cr
47	Misael Chavarría	COOPASAE RL	83958010	mchavarria@coopasae.com
48	Johanna Avila	Mun. Alajuelita	70167002	johandreavila@gmail.com
49	Marco Hidalgo Chaverri	Fundación Neotropica.	2253-2130	mhidalgo@neotropica.org
50	Adriana Fernández	Fundación Neotropica	" "	afernandez@neotropica.org
51	Marcia Carranza V.	Fundación Neotrópica	" "	mcarranza@gmail.neotropica.org

6. Presentación del Plan de Manejo ante el CORAC – Sesión extraordinaria

Lista de Asistencia a actividad
Fecha: 20 octubre 2015
Hora de inicio: 10:00 am
Objetivo: Presentación del Plan General de Manejo de los Cerros de Escazú
Sesión Extraordinaria del Consejo Regional del Área de Conservación Pacífico Central

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Carolina Muñoz Solís	ACOPAC – AC	8842-3749	carolina.munoz@sinac.go.cr
DIEGO CORRALES H	Municipalidad – Suplente	83836550	diego.corrales@muni-su.cr
Guttel Agüero Alfaro	Municipalidad Mora	2249 1050	gestionambiental@mora.go.cr
Sonia Avendaño Mata	ICE	8920-03-26	savendano@ice.go.cr
Lilliana Alvarez.	UNCHSA.	8308-19-68	lillyalvarez@gmail.com.
María Padeco	Asoc. Vecinos d/ Pabellón	8391-8552	mariahurdes.padeco@gmail.com
Henry Guillen	Unión Central / Mun. SJ	88817862	hreville@gmail.com
Alfonso Duarte M	SINAC-ACOPAC	87091085	alfonso.duarte@sinac.go.cr
Ronald Montero R.	Corac-Acopac	89390101	ronanlucas@hotmail.com
Jean Abel Alvarado E	CORAC ACOPAC	87298958	j.alvarado.h@Hotmail.com
Nicolás Abarca N	CORAC Acopac	8343 2207	nicabarcanu@gmail.com

Lista de Asistencia a actividad
Fecha: 20 octubre 2015
Hora de inicio: 10:00 am
Objetivo: Presentación del Plan General de Manejo de los Cerros de Escazú
Sesión Extraordinaria del Consejo Regional del Área de Conservación Pacífico Central

Nombre	Institución / Organización	Teléfono	Correo electrónico
Patricia Mora M.	SINAC-ACOPAC	2416-7068	patricia.mora@sinac.go.cr
